

COORDONNER & PILOTER

Un projet. Une équipe. Un cap.

Spity, le lien entre grimpeurs et clubs.

Dorian Joly



30 min · démonstration incluse

Sommaire

30

minutes pour présenter

24 min d'explications

6 min de démonstration

01	Le projet Spity	01:00 à 03:00
02	Organiser le travail	03:00 à 07:00
03	Suivre et décider	07:00 à 15:00
04	L'équipe et le client	15:00 à 23:00
05	Démontrer et valider	23:00 à 30:00

Du besoin utilisateur à la décision de validation.

Relier les grimpeurs. Simplifier les sorties.

Le besoin du commanditaire fictif : Collectif Altitude Grimpe.

GRIMPEUR


Trouver un partenaire

Un niveau adapté, une discipline commune, une sortie à rejoindre.

CLUB

Organiser une sortie


Publier un événement, gérer les places et retrouver les participants.

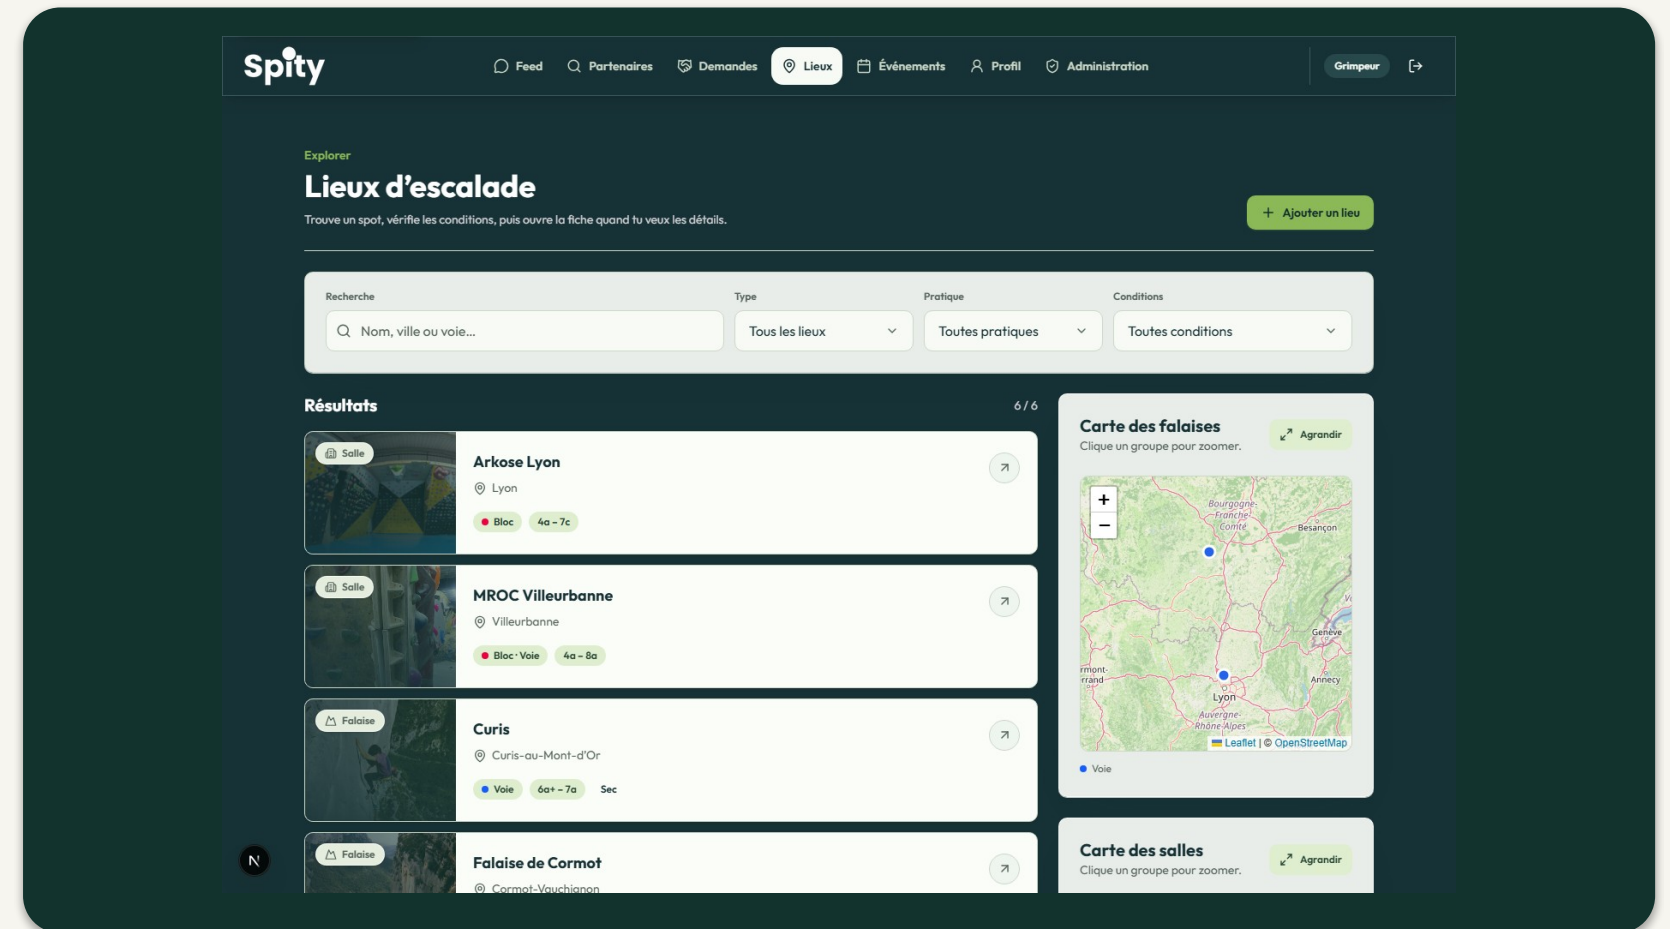

Un parcours démontré : partenaire → événement → inscription.

Spity : un an de développement

Un projet développé sur une année. Les barres présentent la charge estimée dans le Bloc 1.

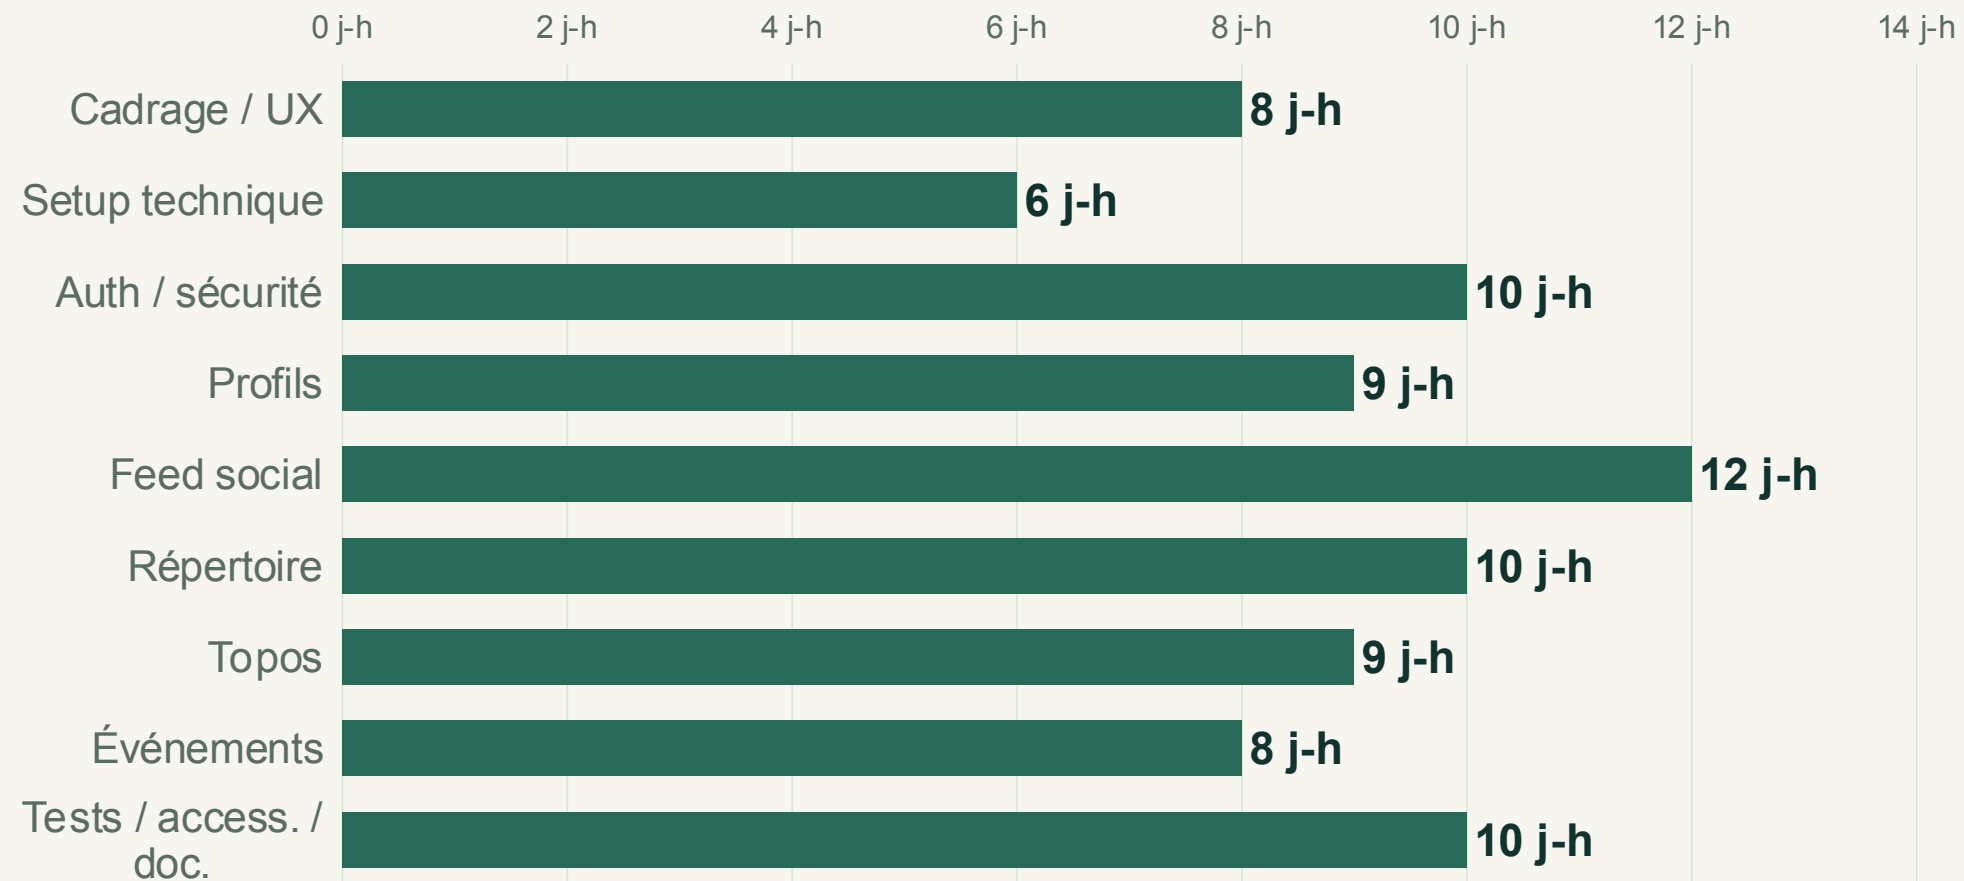

1 an

durée réelle du projet


82 j-h estimés

Charge estimée du MVP.
Référence de cadrage B1.

La suite : un scénario fictif de préparation sur 15 jours, à partir de Spity déjà développé.

Un flux visible, des rendez-vous utiles


Linear : relevé réel. Kanban et rituels Scrum : scénario fictif de 15 jours.

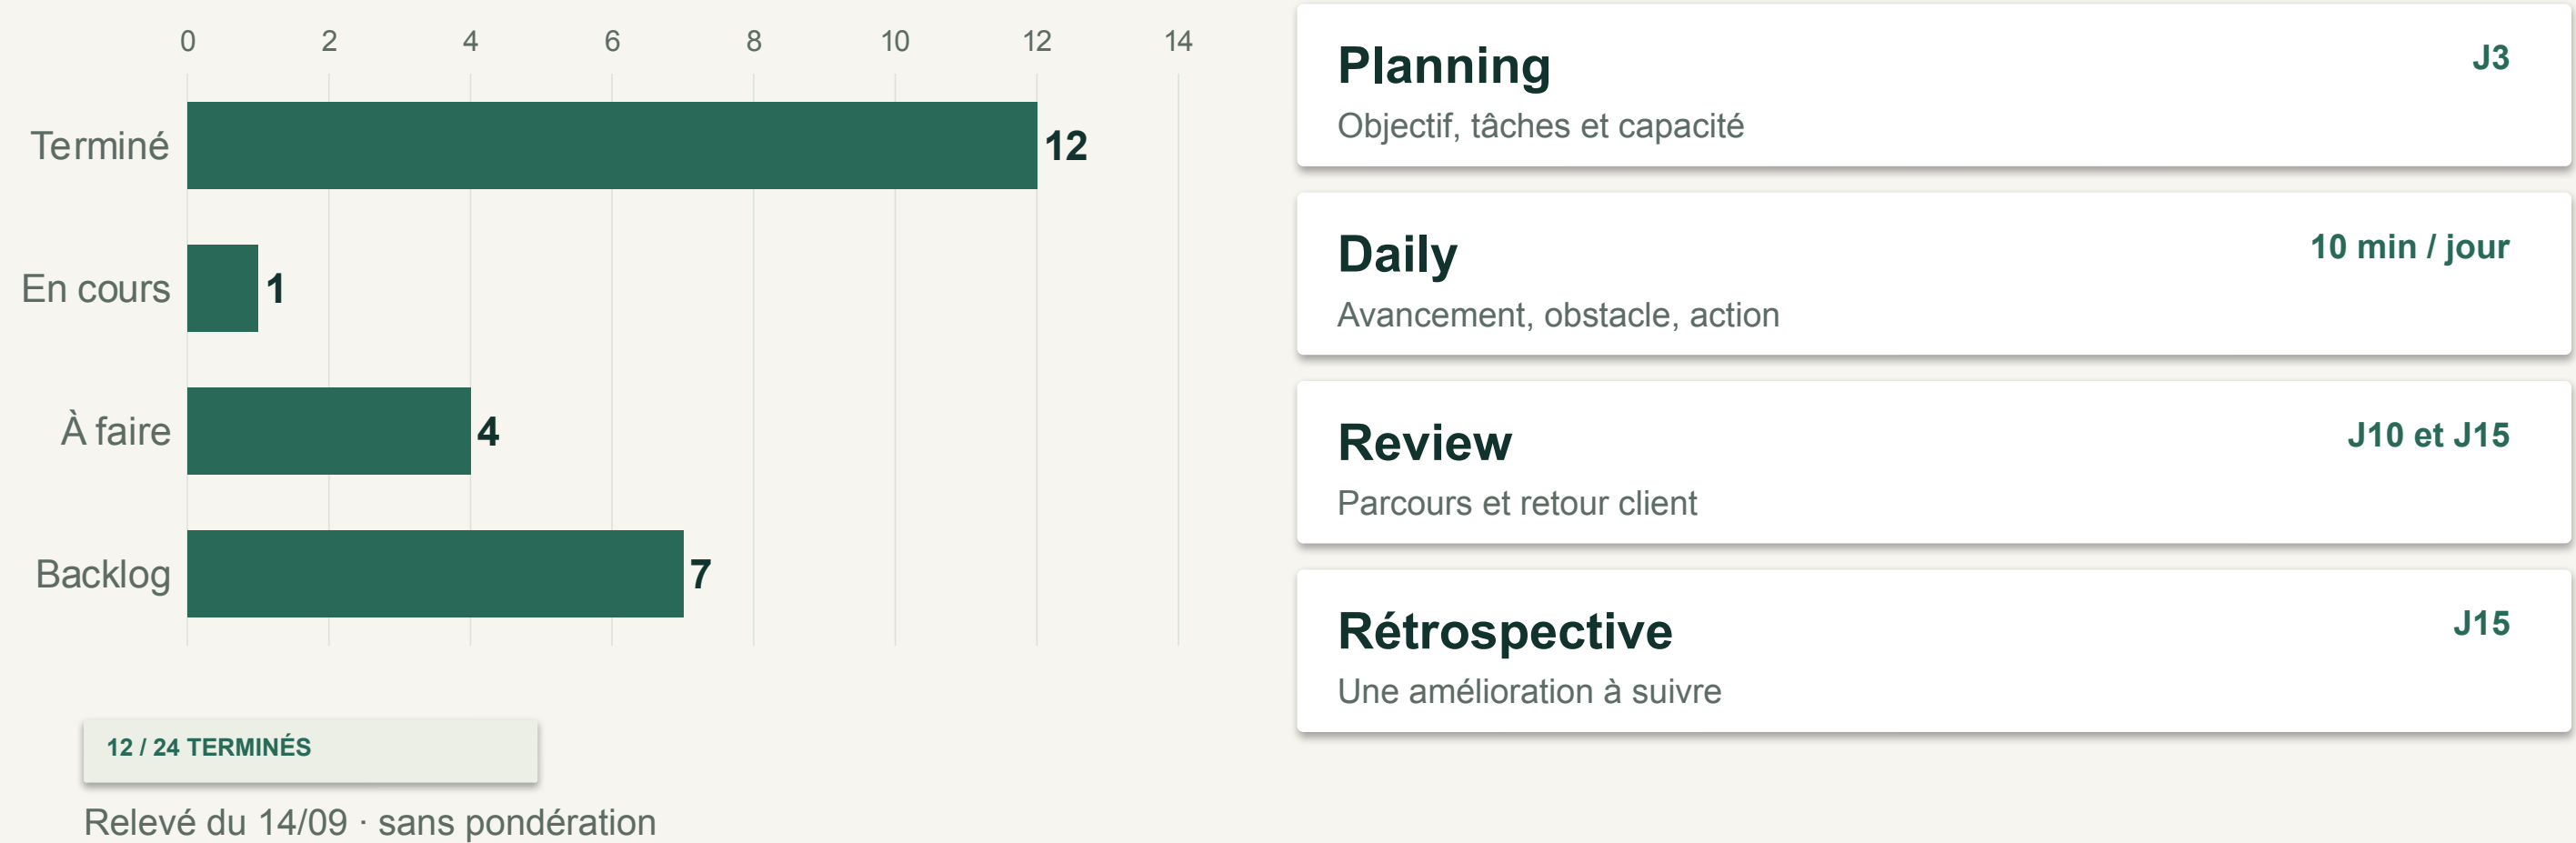

2 tâches en réalisation au maximum. Une réunion produit une action retrouvable.

Scénario fictif : 15 jours de préparation

Développement réel : 1 an. J1 à J15 désignent uniquement les jours ouvrés de cet exercice.

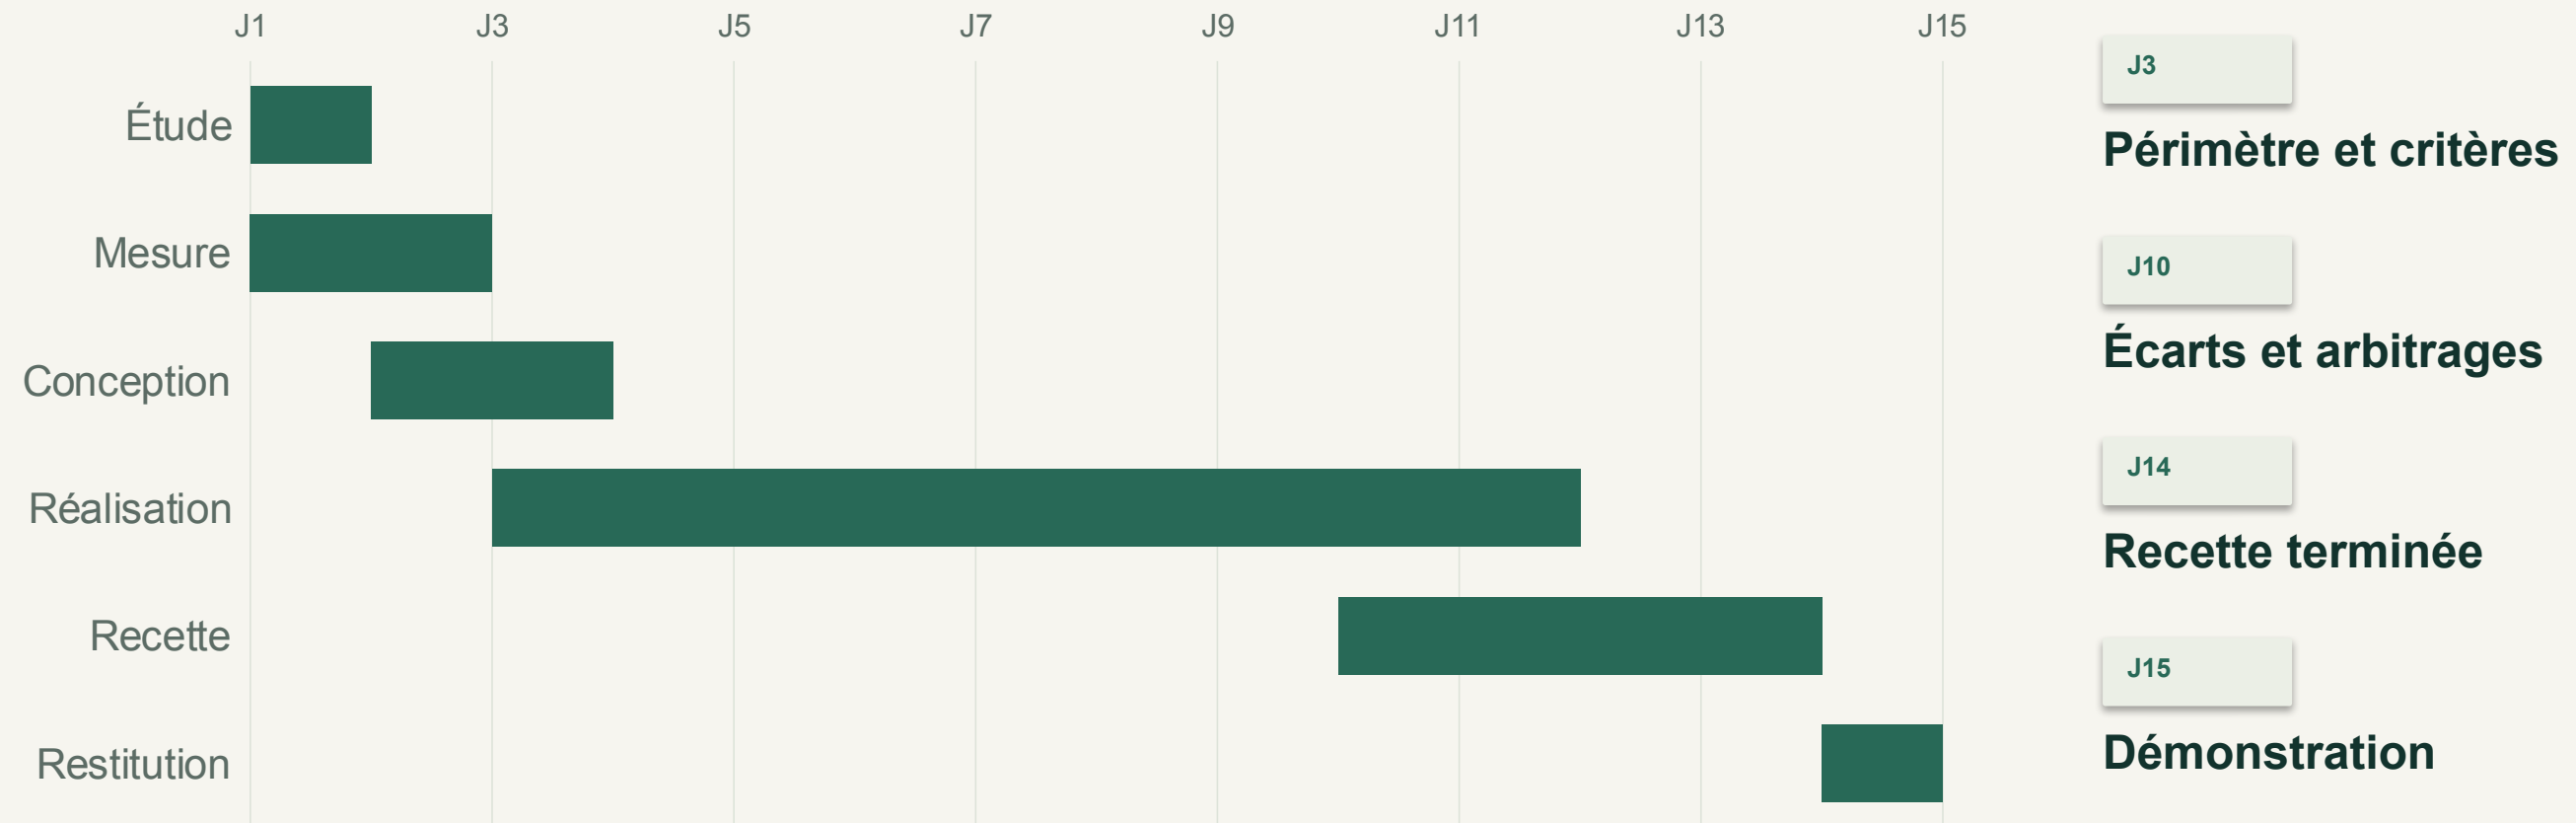

Sur le logiciel existant : préciser les critères, stabiliser les parcours, tester et démontrer.

Des missions claires, des moyens adaptés

Équipe et capacités du scénario. QA signifie assurance qualité.

CP

30 h

Chef de projet

Organiser le travail
Arbitrer les demandes
Préparer la validation

DEV

72 h

Développeur

Réaliser les parcours
Sécuriser les inscriptions
Corriger les anomalies

QA

30 h

Camille


Préparer les critères T02
Recetter les parcours T07
Consignes écrites et sous-titres

Camille : QA malentendante fictive · charge prévue de 24 h pour 30 h disponibles.

Ordinateur, navigateur, base locale. Linear : tâches. Git : versions. RACI : annexe 24.

Anticiper 5 heures de travail supplémentaires

À J10 : 77 h consommées + 40 h restantes = 117 h prévues à terminaison.

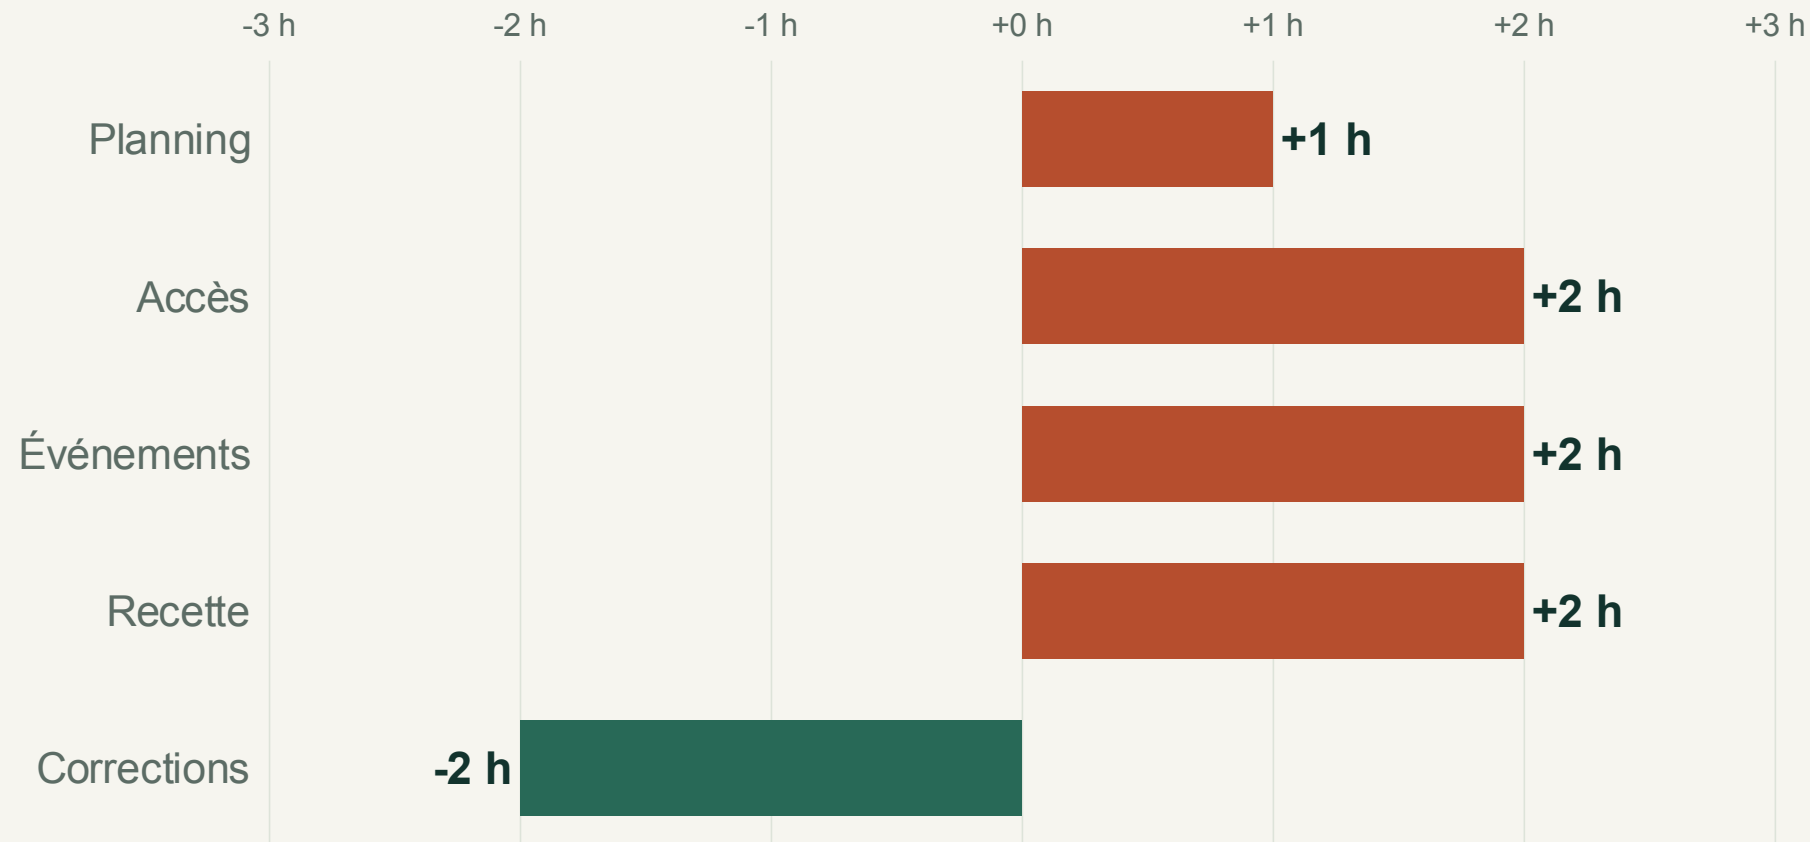

+5 h

112 h → 117 h

Deux dates décalées


Événements : J11 → J12

Recette : J13 → J14

Chaque glissement vaut un jour. Un écart de charge ne se confond pas avec un retard.

Une dérive visible. Une marge encore disponible.

Budget du lot pédagogique ; distinct du budget global B1 de 44 250 €.

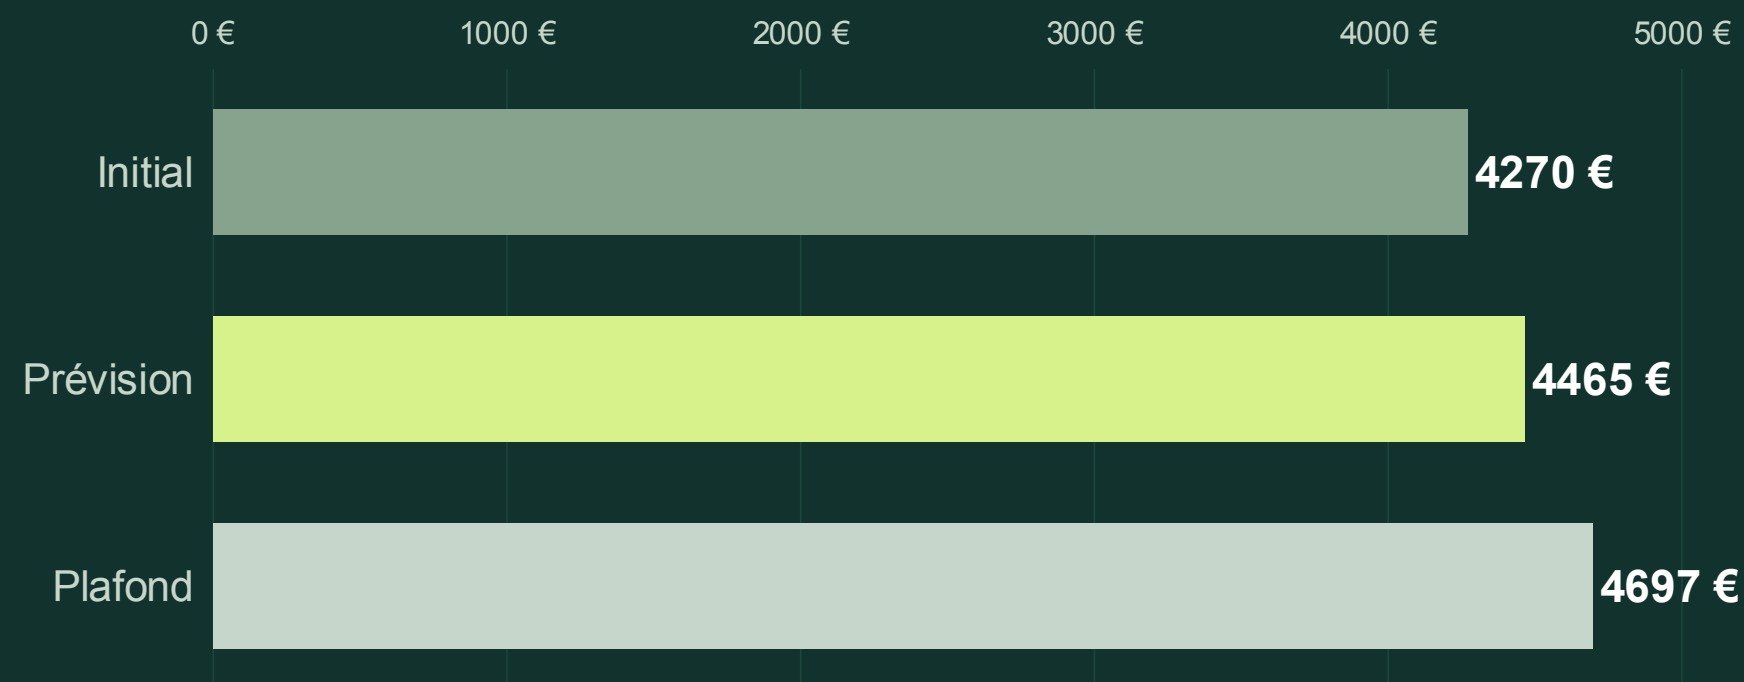

232 €


de marge sous le plafond

+195 € par rapport
à la référence de 4 270 €

La réserve absorbe l'écart ; elle ne le fait pas disparaître.

Le point de tension : la capacité du chef de projet

La charge se compare à la capacité de chaque rôle, pas seulement au total de l'équipe.

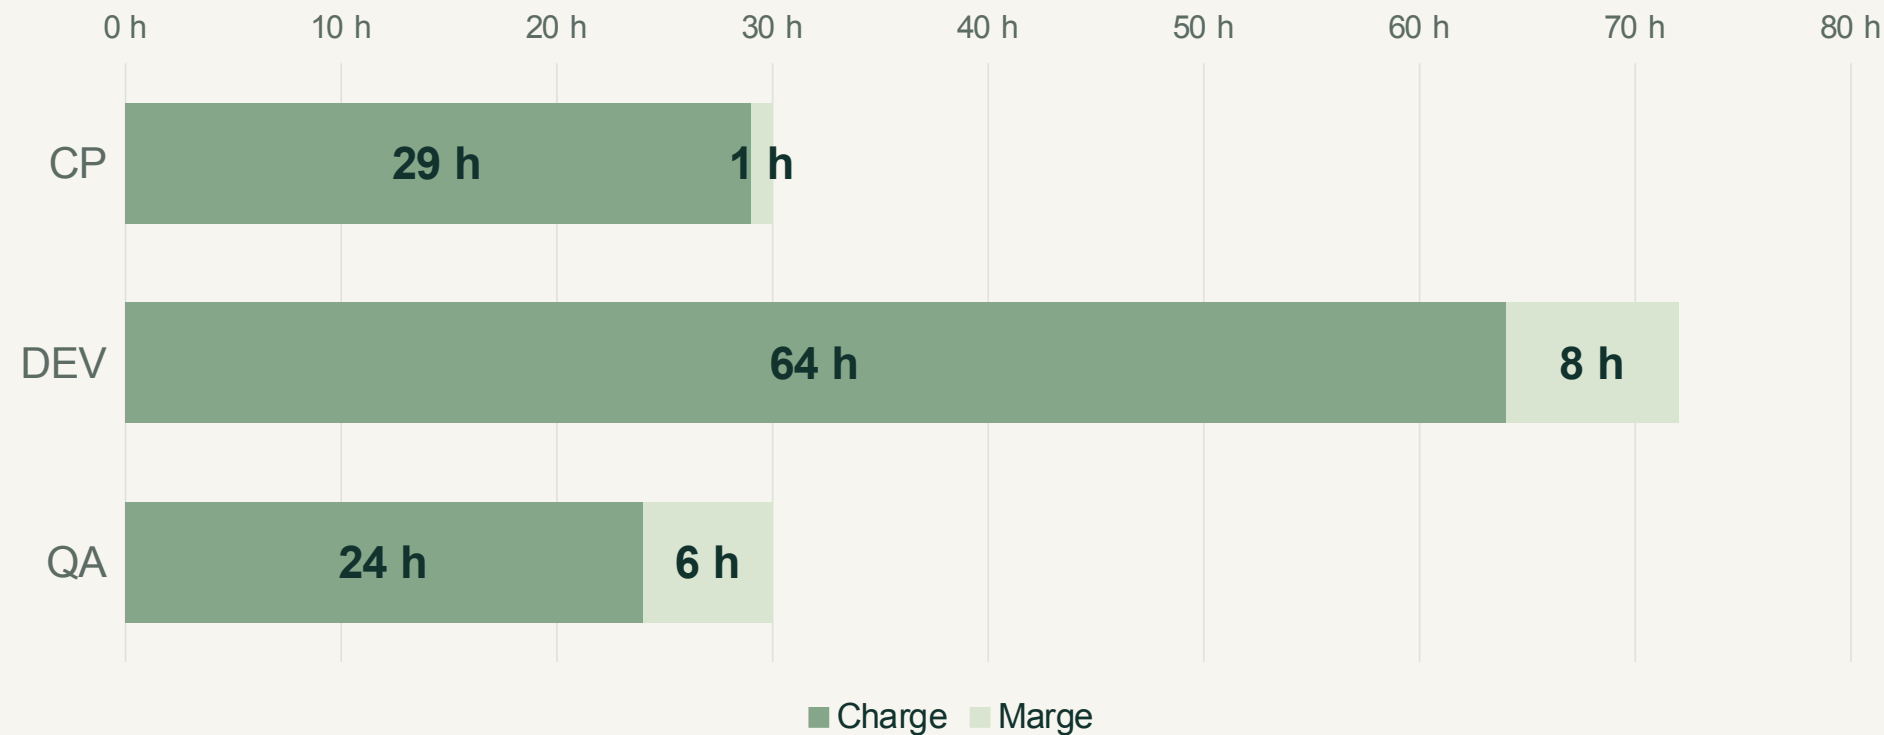

96,7 %

de la capacité CP

1 h de marge


Alerte au-delà de 90 %.
Limiter les demandes.
Protéger les arbitrages.

CP : 29/30 h · DEV : 64/72 h · QA : 24/30 h.

Repérer le risque. Déclencher une action.

Chaque risque possède un responsable, un déclencheur et une réponse dans A03.

PROBABILITÉ

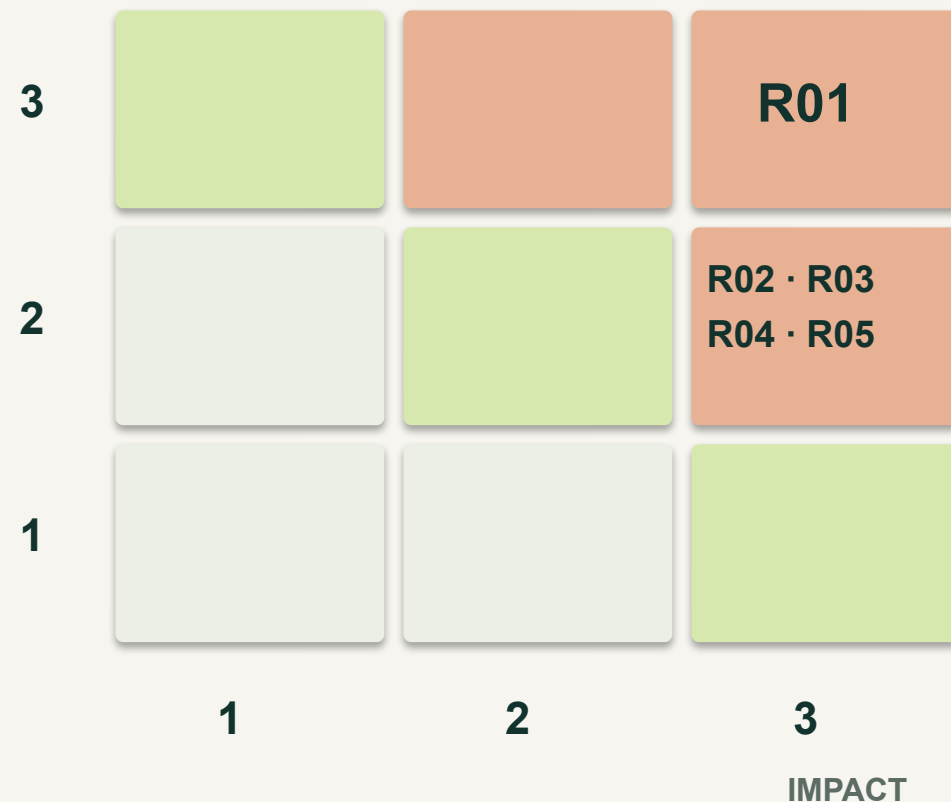

R01

Démonstration

Sonde en échec → vérifier l'environnement.

R02

Charge CP

Plus de 90 % → limiter les demandes.

R03

Périmètre

Plafond dépassé → arbitrer avant engagement.

R04

Inscriptions

Capacité incohérente → bloquer la validation.

R05

Dépôt

Pièce manquante → contrôler la checklist.

Priorité : préserver une démonstration utilisable et un périmètre maîtrisé.

Choisir un test proche du logiciel livré

Problème documenté : les compilations du serveur de développement perturbent la recette.

01

Retries

Ajouter des tentatives

Risque de masquer la cause

02

Préchauffage

Réduire les compilations

Routes à préparer

03

Standalone


Tester le build livré

Construction préalable

Choix visible dans Git : 689e59d · 20 juillet 2026. Comparaison rétrospective.

Reporter les topos pour préserver le lot

Demande fictive à J10 : +12 h DEV et +4 h QA, soit +540 €.

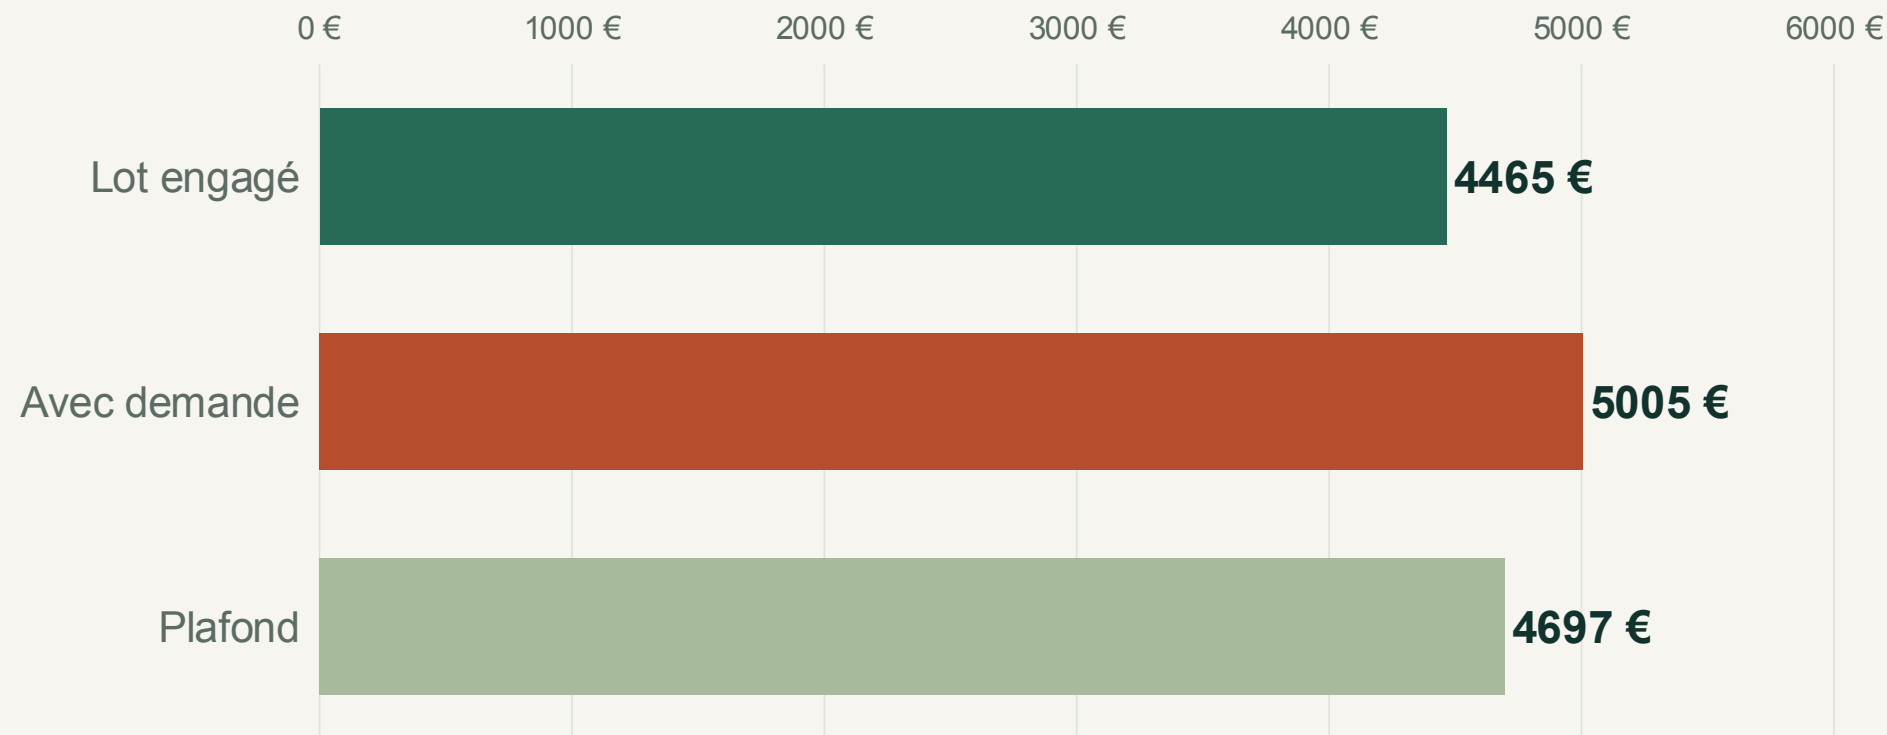

DÉCISION DU CAS

Report

-308 € de marge
DEV : 76 h / 72 h

Les critères de recette
restent inchangés.

Ajouter, réduire la recette ou reporter : la décision protège la qualité et la capacité.

Adapter la posture à la situation

Cas fictif : DEV veut ajouter une fonction ; QA attend un parcours stable.

PARTICIPATIF

Écouter

Comparer les options et leurs impacts.

PERSUASIF

Expliquer

Justifier le report auprès du client.

DIRECTIF

Fixer

Maintenir les critères de livraison.

DÉLÉGATIF

Confier

Donner un résultat et un contrôle.

Rétro J15 : sortir les diagnostics techniques du daily ; CP suit la prochaine action.

Une équipe à distance, des décisions accessibles

Camille, QA malentendante fictive · scénario Paris / Montréal.

Situation	Aménagement retenu
Réunions	Sous-titres testés ; une personne parle à la fois.
Décisions	Synthèse écrite, responsable et échéance.
Formation	Consignes écrites et démonstration sous-titrée.

J3	Comprendre	J10	Retrouver	J14	Réaliser sans aide
----	------------	-----	-----------	-----	--------------------

Paris / Montréal : créneau commun avec fuseaux, avis écrits, glossaire FR/EN et reformulation.

Cibler les écarts qui menacent le lot

Grille du scénario : niveau actuel, cible et justification commentée dans les notes.

Rôle	Compétence	Actuel	Cible
CP	Planning et suivi des écarts	1	2
CP	Animation et arbitrage	2	2
DEV	Développement typé et validation	2	2
DEV	Transactions et concurrence	1	2
Camille, QA	Recette navigateur reproductible	1	2
Camille, QA	Clavier et formulaires	1	2

0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.

Six heures pour renforcer l'autonomie

6 h incluses dans les tâches · 60 € de ressources complémentaires dans le scénario.

CP

J3

1 h

Tableau de bord

Expliquer un écart recalculé.

DEV

J9–J12

2 h

Concurrence

Une place, une seule inscription acceptée.

Camille, QA

J10–J14

3 h

Recette + clavier

Rejouer un cas sans aide.

Camille : 2 h de recette + 1 h de clavier ; consignes écrites et démonstration sous-titrée.

À J12 : si une compétence critique reste indisponible, arbitrer le besoin RH (annexe 26).

Transformer la review en décision

CR02 · J10 · compte rendu fictif avec Claire Martin, Collectif Altitude Grimpe.

01 / CONSTAT

Un écart à traiter

Événements : J11 → J12

Prévision : 4 465 €

02 / DÉCISION

Reporter les topos

Maintenir le périmètre
et les critères de recette.

03 / ACTIONS

Responsables et dates

DEV : T06 à J12

QA : recette J14 · CP : J15

J3

Périmètre

J10

Review / CR02

J15

Validation / CR03

A07 centralise les comptes rendus et critères. La rétrospective suit la review J15.

Mesurer la satisfaction pour agir

Protocole proposé à J15 : 2 grimpeurs et 1 club. Résultats réels non mesurés.

100 %

Critères critiques

Acceptés / évalués

$\geq 80 \%$

Parcours sans aide

Réussis sans aide / tentés

$\geq 4/5$

Utilité perçue

Moyenne des notes + effectif

0

Blocage critique

Tâches empêchées encore
ouvertes

Sous le seuil : qualifier le problème → affecter une correction → vérifier à nouveau.

DÉMONSTRATION EN DIRECT

Passer du suivi à l'usage.


6 min

Une session grimpeur.
Une session club.



Trouver un partenaire

Parcours grimpeur

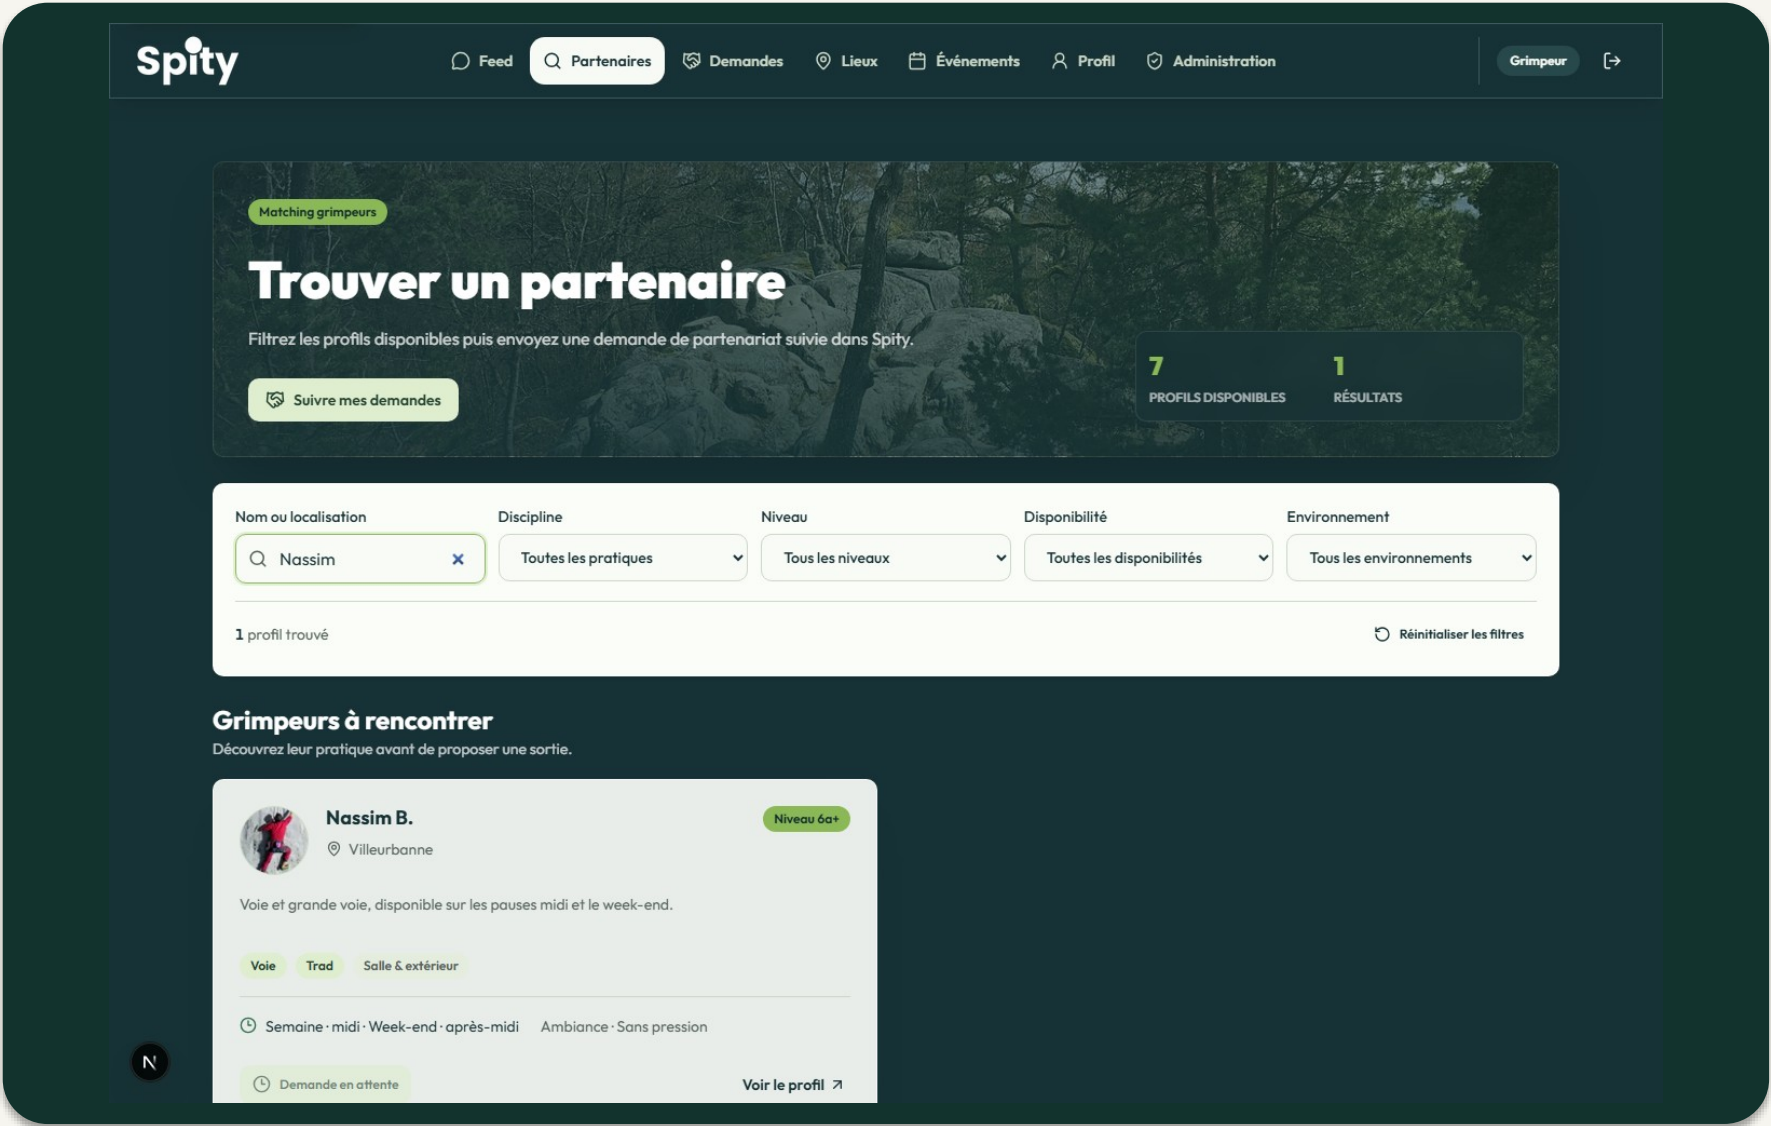

01

Profil

02

Filtres


03

Demande

Capture de secours · 15/09/2026

Retrouver les participants

Parcours club

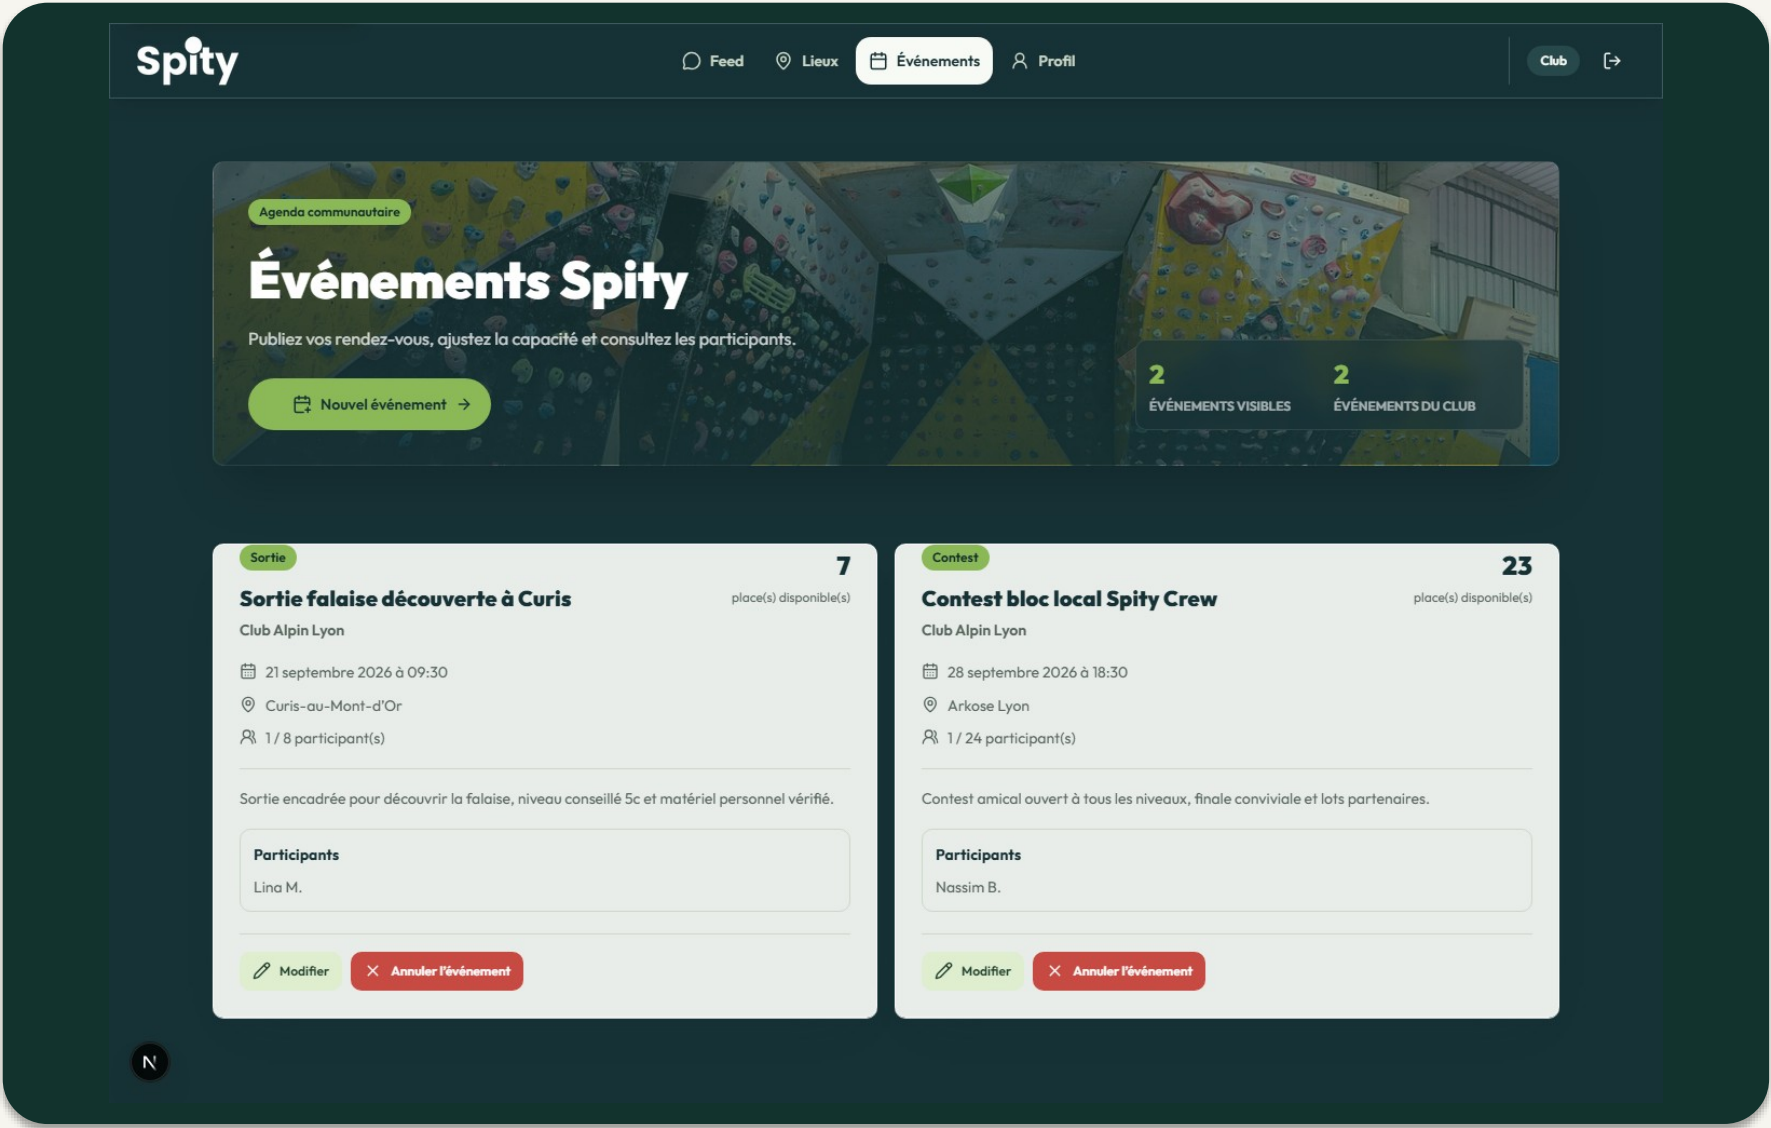

01

Événement

02

Inscription

03

Participants

Capture de secours · 15/09/2026

Valider ce qui a été réellement démontré

Quatre critères, puis une décision explicite sur le périmètre présenté.

Partenaire

Filtres cohérents et état de demande clair.

Inscription

Confirmation et capacité respectée.

Organisation club

Participant visible et commandes autorisées.

Utilisation

Commandes nommées et parcours au clavier.

Accepté / Accepté avec réserve / Refusé

Chaque réserve : une action, un responsable, une échéance. Transmission au Bloc 4.

Qui réalise ? Qui décide ?

CP : chef de projet · DEV : développeur · QA : Camille · client fictif.

Activité	CP	DEV	QA	Client
Périmètre et critères	R	C	C	A
Planification et affectation	A/R	C	C	I
Réalisation	A	R	C	I
Recette des parcours	A	C	R	C
Corrections	A	R	C	I
Arbitrage délai, coût, périmètre	R	C	C	A
Acceptation de la démonstration	R	C	C	A

R : réalise · A : décide · C : consulté · I : informé.

Quand le budget ou la capacité basculent

Variantes indépendantes : leurs coûts ne se cumulent pas.

Hypothèse	Prévision	Marge	Capacité
J10	4 465 €	232 €	Respectée
QA +6 h	4 645 €	52 €	Respectée
DEV +8 h	4 745 €	-48 €	Respectée
CP +2 h	4 555 €	142 €	CP : 31 / 30 h
Topos +16 h	5 005 €	-308 €	DEV : 76 / 72 h

Une marge budgétaire positive ne garantit pas une capacité suffisante par métier.

Préparer un renfort, sans l'engager

Fiche conditionnelle préparée par CP ; non envoyée, non activée.

Point à transmettre	Besoin conditionnel
Déclencheur à J12	Compétence critique indisponible après formation.
Mission et disponibilité	Renfort QA : 4 h à J12–J13 ; recette transmissible à Camille.
Sélection et accueil	Exercice accessible, disponibilité à confirmer ; accueil CP : 0,5 h.
Coût supplémentaire	180 € de renfort + 22,50 € CP = 202,50 €.
Arbitrage avant engagement	Prévision : 4 667,50 € · marge : 29,50 € · CP : 29,5/30 h.

| Décider sur le besoin, la disponibilité, le coût et l'accueil du renfort.
