

PROJET SOLO · 1 AN

Une année pour construire Spity.

Du besoin des grimpeurs à un site déployé.

Dorian Joly



Sommaire

Du besoin utilisateur à la validation du logiciel.

Du besoin à l’usage.

Organiser le travail.
Vérifier le résultat.

01	Planifier le projet	C3.1
02	Suivre l’avancement	C3.2.1
03	Arbitrer	C3.2.2
04	Manager et communiquer	C3.3.1
05	Développer les compétences	C3.3.2
06	Suivre avec le client	C3.4.1
07	Démontrer et valider	C3.4.2

Relier les grimpeurs. Simplifier les sorties.

Deux besoins concrets pour guider les fonctionnalités.

GRIMPEUR


Trouver un partenaire

Discipline, niveau et profil pour préparer une sortie.

CLUB

Organiser un événement

Places disponibles, inscriptions et liste des participants.

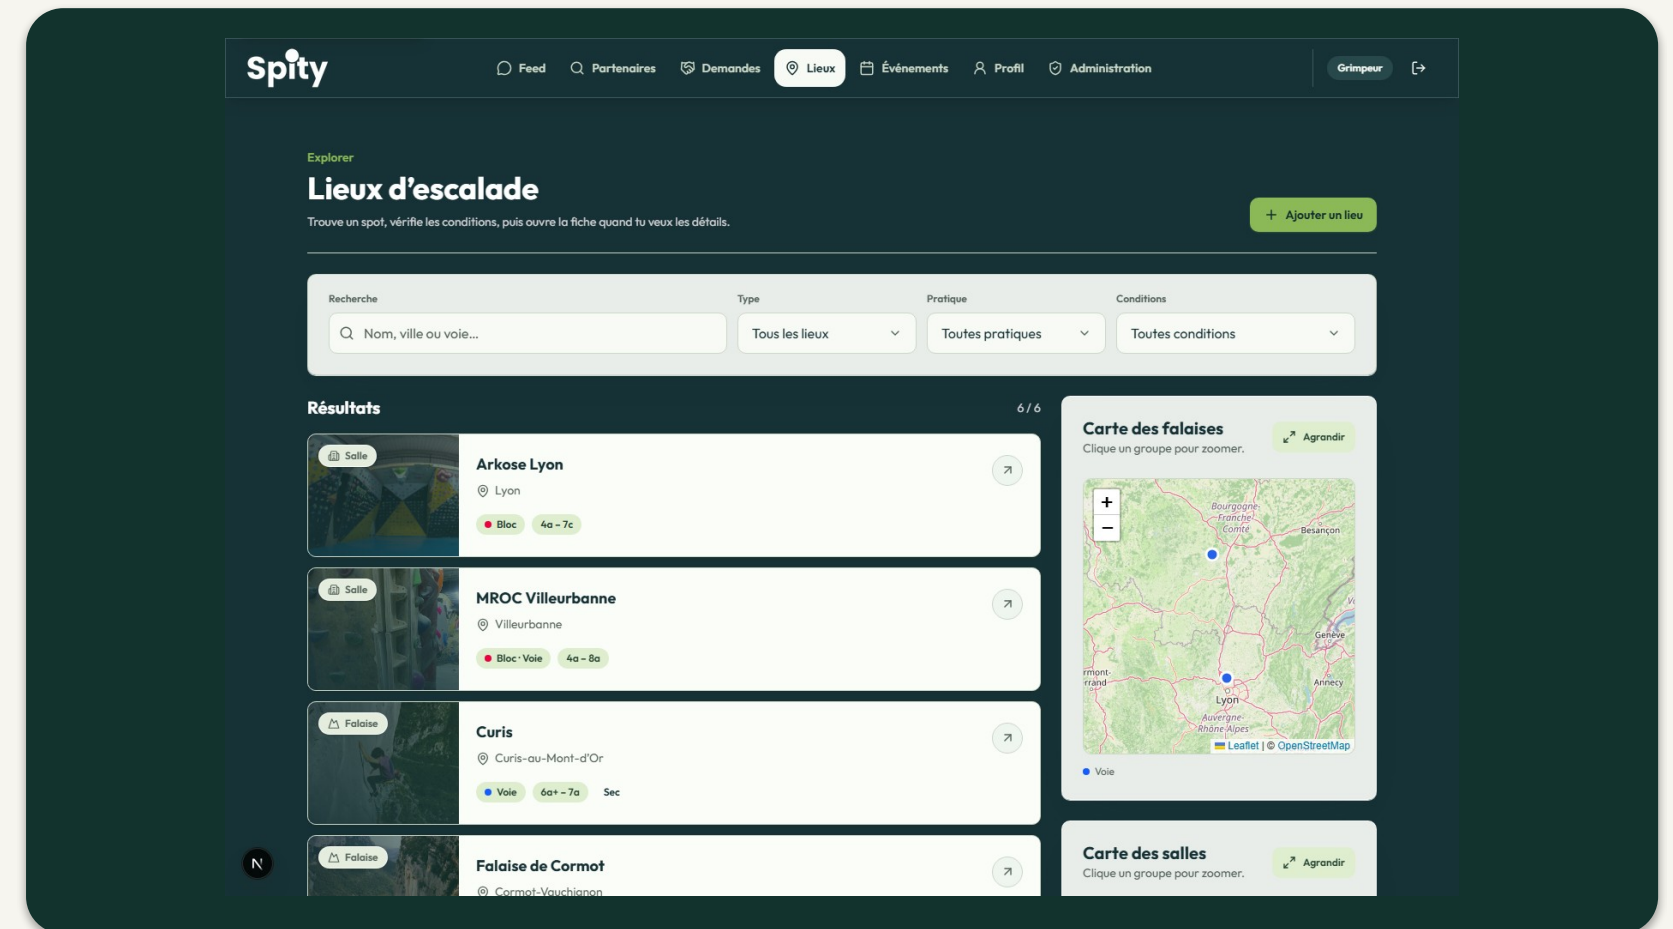

Parcours présenté : partenaire → événement → inscription.

Une méthode adaptée au travail solo

Un flux de tâches, des jalons et des contrôles.

FLUX

Linear

Rendre visibles les priorités et les états ; limiter la dispersion.

CALENDRIER

Rétroplanning

Visualiser les phases, dépendances et points de validation.

QUALITÉ


Git + CI

Versionner les changements et conserver les résultats des contrôles.

Relier les priorités du backlog aux jalons et aux résultats des contrôles.

Planifier les travaux sur une année

Planning annuel reconstruit · neuf lots issus du cadrage.

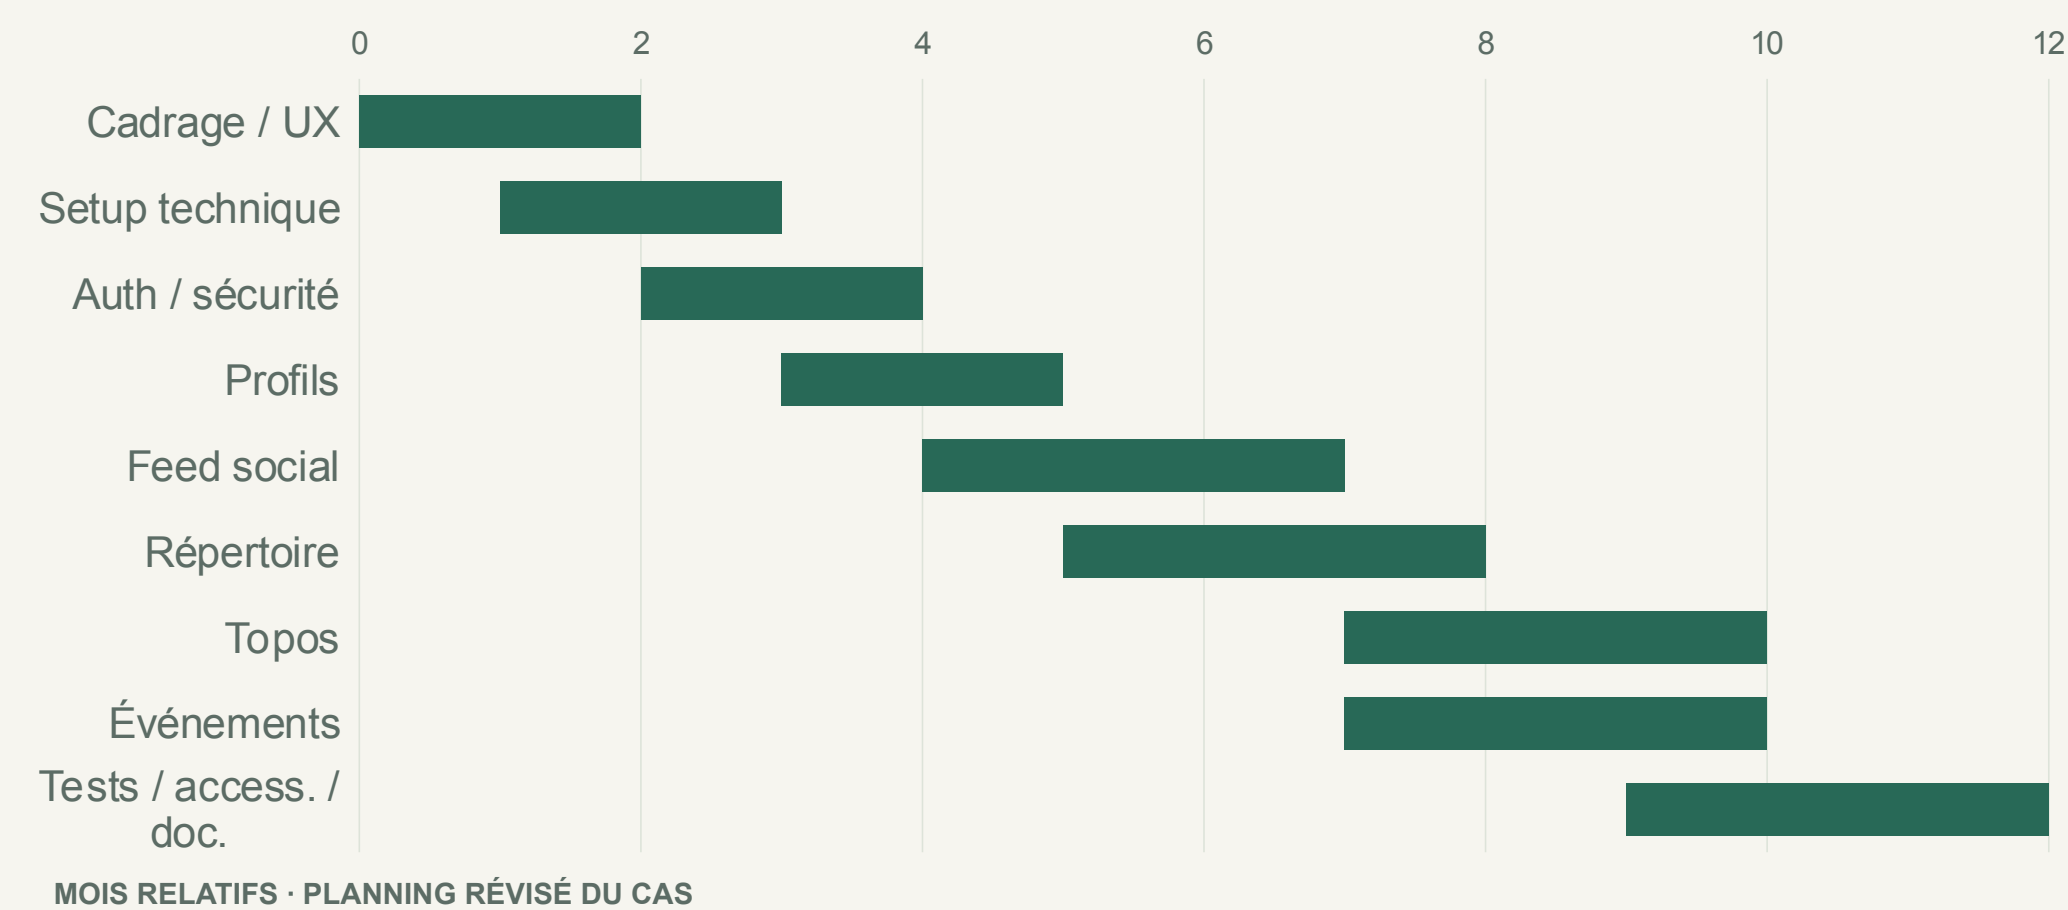

82
j-h estimés B1

Dépendances :
accès → profils
événement → inscription

Étude M1 · mesure M2 puis M10–11 · conception M2–3 · réalisation M3–10 · restitution M12.

Affecter les missions et prévoir les moyens

Projet solo · mise en situation d’une recette avec un testeur ponctuel.

Mission	Réalise / décide	Moyens et adaptation
Cadrage, développement, livraison	Dorian : R / A	Poste, Git, Next.js, MariaDB, Docker, VPS
Recette ponctuelle — simulée	Testeur fictif : R ; Dorian : A	Critères écrits, comptes dédiés et retours reproductibles
Décision de validation — simulée	Représentant club fictif : A	Dorian prépare la démonstration et les réserves
Accessibilité — simulée	Persona testeur malentendant	Sous-titres vérifiés, écrit, prise de parole organisée

R = réalise ; A = décide. Budget initial : 44 250 € estimés dans le cadrage.

L'avancement réel des fonctionnalités

Fonctionnalités disponibles et suites identifiées · bilan du 16 septembre 2026.

DÉJÀ DISPONIBLE

Authentification	Inscription et connexion grimpeur / club
Profils	Disciplines, niveaux, matériel et avatar
Publications	Texte, image, likes et commentaires simples
Carte interactive	Salles et falaises géolocalisées
Topos collaboratifs	Ajout de voies, signalements, liens et PDF
Événements	Création, inscriptions et capacité

À COMPLÉTER

Sessions	Renouvellement et rotation des jetons
Publications	Modification, suppression et tags contextuels
Clubs	Carte, coachs et validation d'affiliation
Topos	Votes de consensus et modération des voies
Fil social	Personnalisation et événements épinglés
Tableau de bord club	Statistiques historiques et agrégées

Je suis le périmètre livré et le reste à faire pour prioriser les prochaines évolutions.

Un tableau de bord pour décider

Mise en situation · suivi annuel au mois 10.

Indicateur	Référence → prévision	Lecture et action
Charge	82 → 86 j-h	58 consommés simulés + 28 restants
Coût	44 250 → 46 050 €	+1 800 € ; réexaminer le reste à faire
Délai	Fin M11 → fin M12	+1 mois ; annoncer le nouveau jalon
Capacité solo	12 j-h prévus / 10 disponibles	120 % ; reporter 2 j-h hors période

Revue hebdomadaire proposée : mettre à jour les entrées, expliquer les écarts, décider et tracer.

Anticiper les points de vigilance

Mise en situation · signaux d’alerte et réponses associées.

Risque	Signal / seuil proposé	Réponse et responsable
Surcharge solo	Charge / capacité > 100 %	Dorian : déplacer une tâche et revoir le jalon
Parcours non fiable	Un critère critique en échec	Dorian : corriger avant validation
Démo indisponible	Connexion ou santé en échec	Dorian : diagnostiquer ; secours daté
Recette inaccessible	Consigne non comprise / sous-titres KO	Dorian : support écrit et essai avant séance

Contrôler à chaque revue : avancement, coûts, délais, risques et disponibilité des ressources.

Arbitrer face à une navigation trop lente


Cas réel du 15 septembre : un calcul décoratif bloque le navigateur.

Option analysée	Intérêt	Limite / décision
Garder l'animation	Conserver tout le mouvement	Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer	Préserver potentiellement l'animation	Gain non mesuré pour cette option
Fond SVG statique	Conserver le motif sans calcul animé	Choix implémenté ; perte du mouvement

Choix retenu : conserver le motif graphique avec un SVG statique et rendre l'attente visible.

Mesurer l'effet de la correction

Mesures locales contrôlées du 15 septembre ; un passage par parcours.

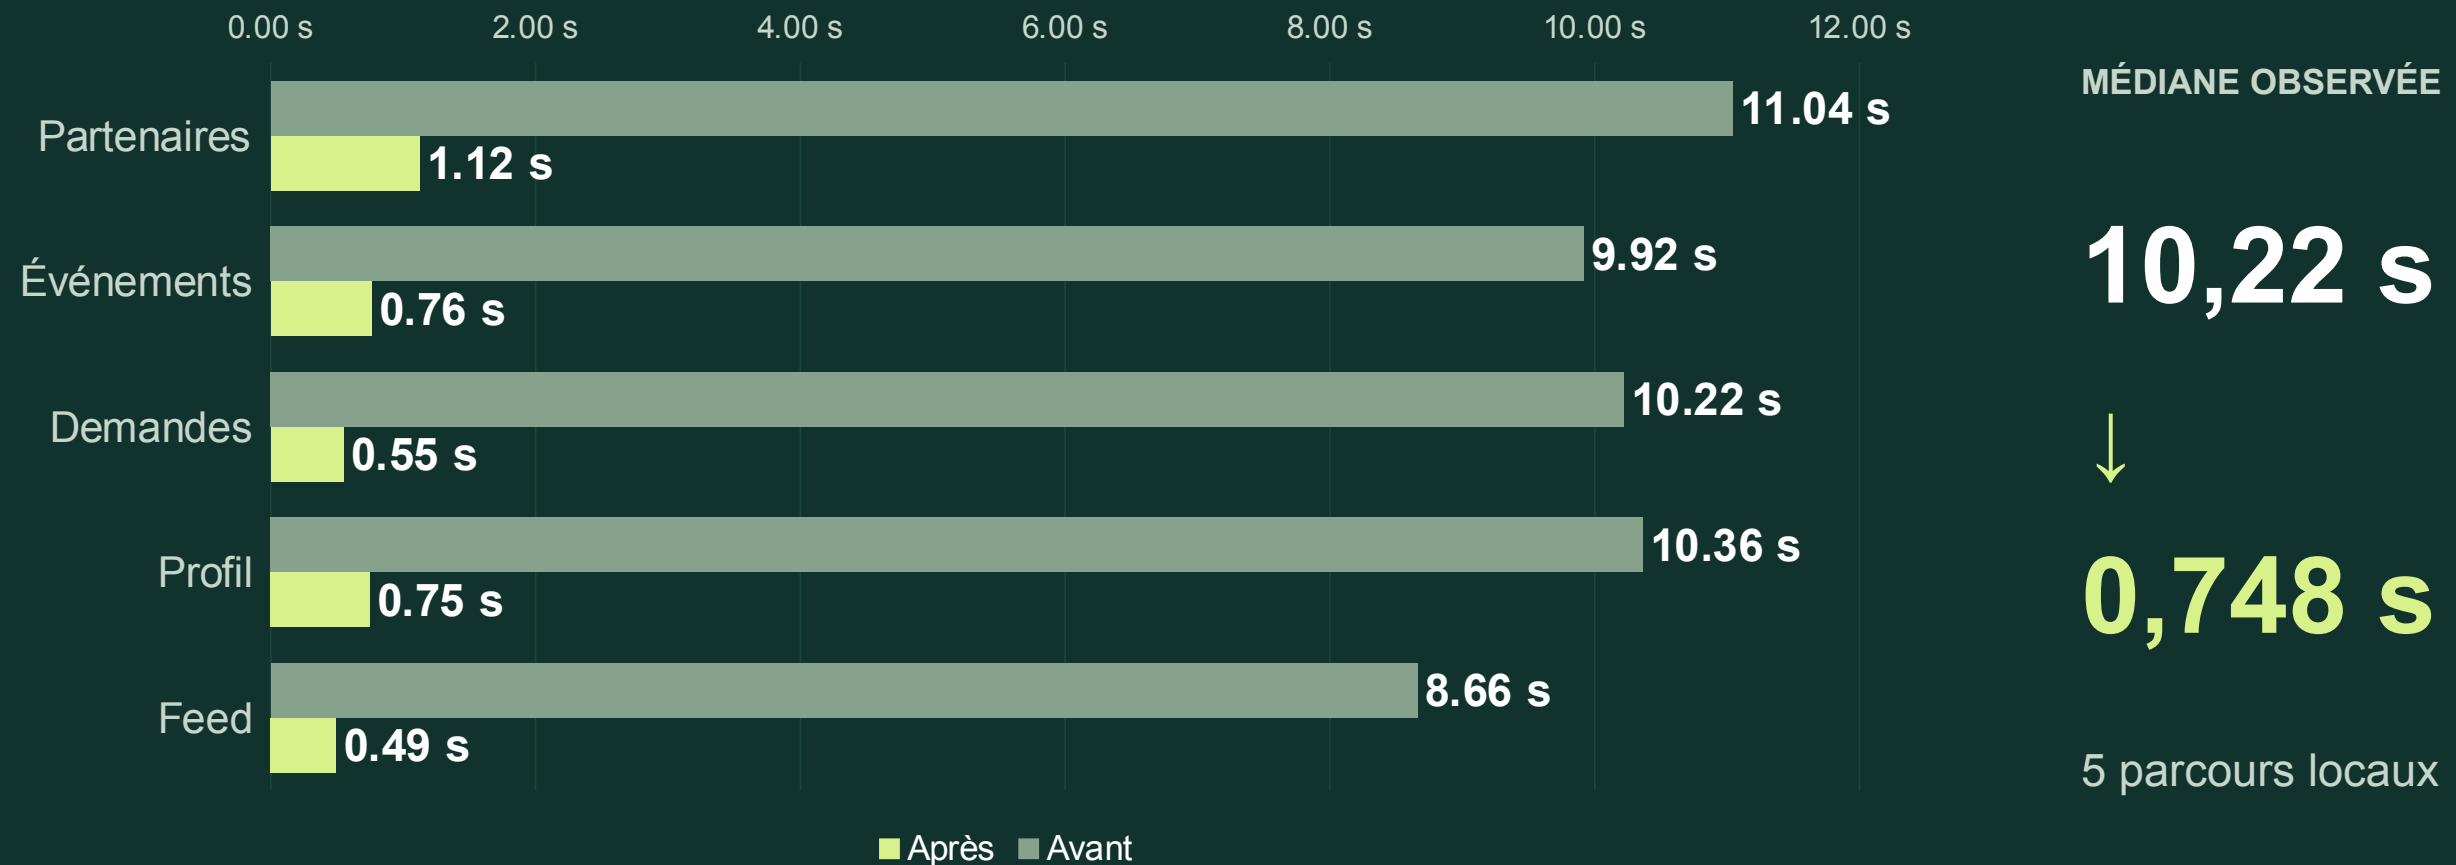

CPU ×4 · latence 100 ms · mêmes parcours. Ces temps ne sont pas des mesures de production.

Adapter la posture à une situation précise

Mise en situation · arbitrer les priorités avec un testeur ponctuel.

PARTICIPATIF

Écouter les faits

Le testeur veut corriger les blocages ; le porteur veut enrichir le décor.

PERSUASIF

Expliquer le choix

Prioriser le parcours utilisable avec les critères et les mesures.

DIRECTIF

Fixer la limite

Aucune validation si un critère critique reste en échec.

DÉLÉGATIF

Confier la recette

Résultat attendu, autonomie et point de contrôle convenus.

Analyse critique : décider seul trop vite peut faire perdre une alerte utile ; écouter puis trancher.

Organiser une collaboration accessible

Mise en situation · charge, accessibilité et travail à distance.

Point	Organisation proposée	Contrôle
Charge de la séance	Porteur 4 h / 5 h ; testeur 4 h / 5 h	80 % chacun ; 1 h de marge
Accessibilité	Consignes écrites, sous-titres, une voix à la fois	Le testeur reformule puis retrouve la décision
Distance et langues	Créneau commun avec fuseaux, glossaire FR/EN	Compréhension vérifiée sans supposer la langue
Outils partagés	Linear : action ; Git : version ; dossier : preuves	Un lien commun vers critères et compte rendu

Préparation écrite → point de coordination → action et responsable → retour asynchrone.

Évaluer les compétences utiles au projet

Mise en situation · niveaux de départ et objectifs de progression.

Rôle du cas	Compétence	Actuel → cible
Porteur	Planning et suivi des écarts	1 → 2
Porteur	Développement et API	2 → 2
Testeur fictif	Recette reproductible	1 → 2
Testeur fictif	Parcours clavier	1 → 2

0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.

Prévoir une progression vérifiable

Plan de formation proposé dans la mise en situation.

Public / moment	Action et modalité	Résultat attendu
Porteur · avant M10	1 h : atelier de recalcul du suivi	Expliquer seul le coût et le décalage
Testeur · avant M11	2 h : recette et clavier, exercice guidé	Rejouer un cas et décrire un défaut
Adaptation au handicap	Écrit, sous-titres, pauses et durée adaptées	Vérifier la compréhension avant autonomie
Besoin persistant	Renfort QA conditionnel de 4 h	Fiche de besoin préparée en annexe 26

Évaluer après pratique ; si l'écart persiste, adapter la formation puis arbitrer un renfort.

Un compte rendu qui aide à décider

Compte rendu simulé · point d'avancement au mois 10.

CONSTAT

Un écart annoncé

Prévision simulée : +1 800 € et +1 mois. Retour : garder un parcours fluide.

DÉCISION

Prioriser l'usage

Conserver le fond statique ;
maintenir les critères de recette.

ACTIONS

Préparer la validation

Porteur : réviser le suivi.
Testeur : préparer M11. Club :
revoir les critères.

Compte rendu structuré : contexte → faits → décision → responsable → prochaine validation.

Prévoir les points de validation

Mise en situation · validations au fil du projet.

Point	Livrable examiné	Décision attendue
M3 · cadrage	Besoin et critères du parcours	Confirmer le périmètre
M10 · évolution	Écarts, options et version disponible	Arbitrer et réviser la prévision
M11 · recette	Résultats des critères et réserves	Corriger ou autoriser la démo
M12 · restitution	Dernière version et parcours complet	Accepter, réserver ou refuser

Chaque réserve : problème précis, action, responsable et échéance à convenir.

Mesurer le retour pour agir

Objectifs proposés · résultats de satisfaction non mesurés.

Indicateur	Calcul / recueil	Cible pédagogique
Réussite sans aide	Parcours réussis / tentés ; noter l'effectif	≥ 80 %
Utilité perçue	Note de 1 à 5 ; moyenne et répondants	≥ 4 / 5
Conformité critique	Critères critiques acceptés / évalués	100 %
Blocages	Nombre de tâches empêchées ouvertes	0 avant acceptation

Sous la cible : qualifier → prioriser → corriger → vérifier à nouveau. Résultats : non mesurés.

Les critères de validation

Quatre critères pour évaluer le parcours utilisateur.

Parcours	Résultat attendu	Parcours
Partenaire	Filtres adaptés et état de demande clair	Session grimpeur
Inscription	Confirmation et capacité cohérentes	Événement de démonstration
Organisation club	Participants et commandes autorisées	Session club distincte
Utilisation	Navigation et commandes au clavier	Manipulation en direct

Vérifier chaque critère sur la version présentée.

DÉMONSTRATION EN DIRECT

Passer du suivi à l'usage.


Deux sessions pour un parcours complet.

Grimpeur → Club



Trouver un partenaire

Parcours grimpeur · base de démonstration.

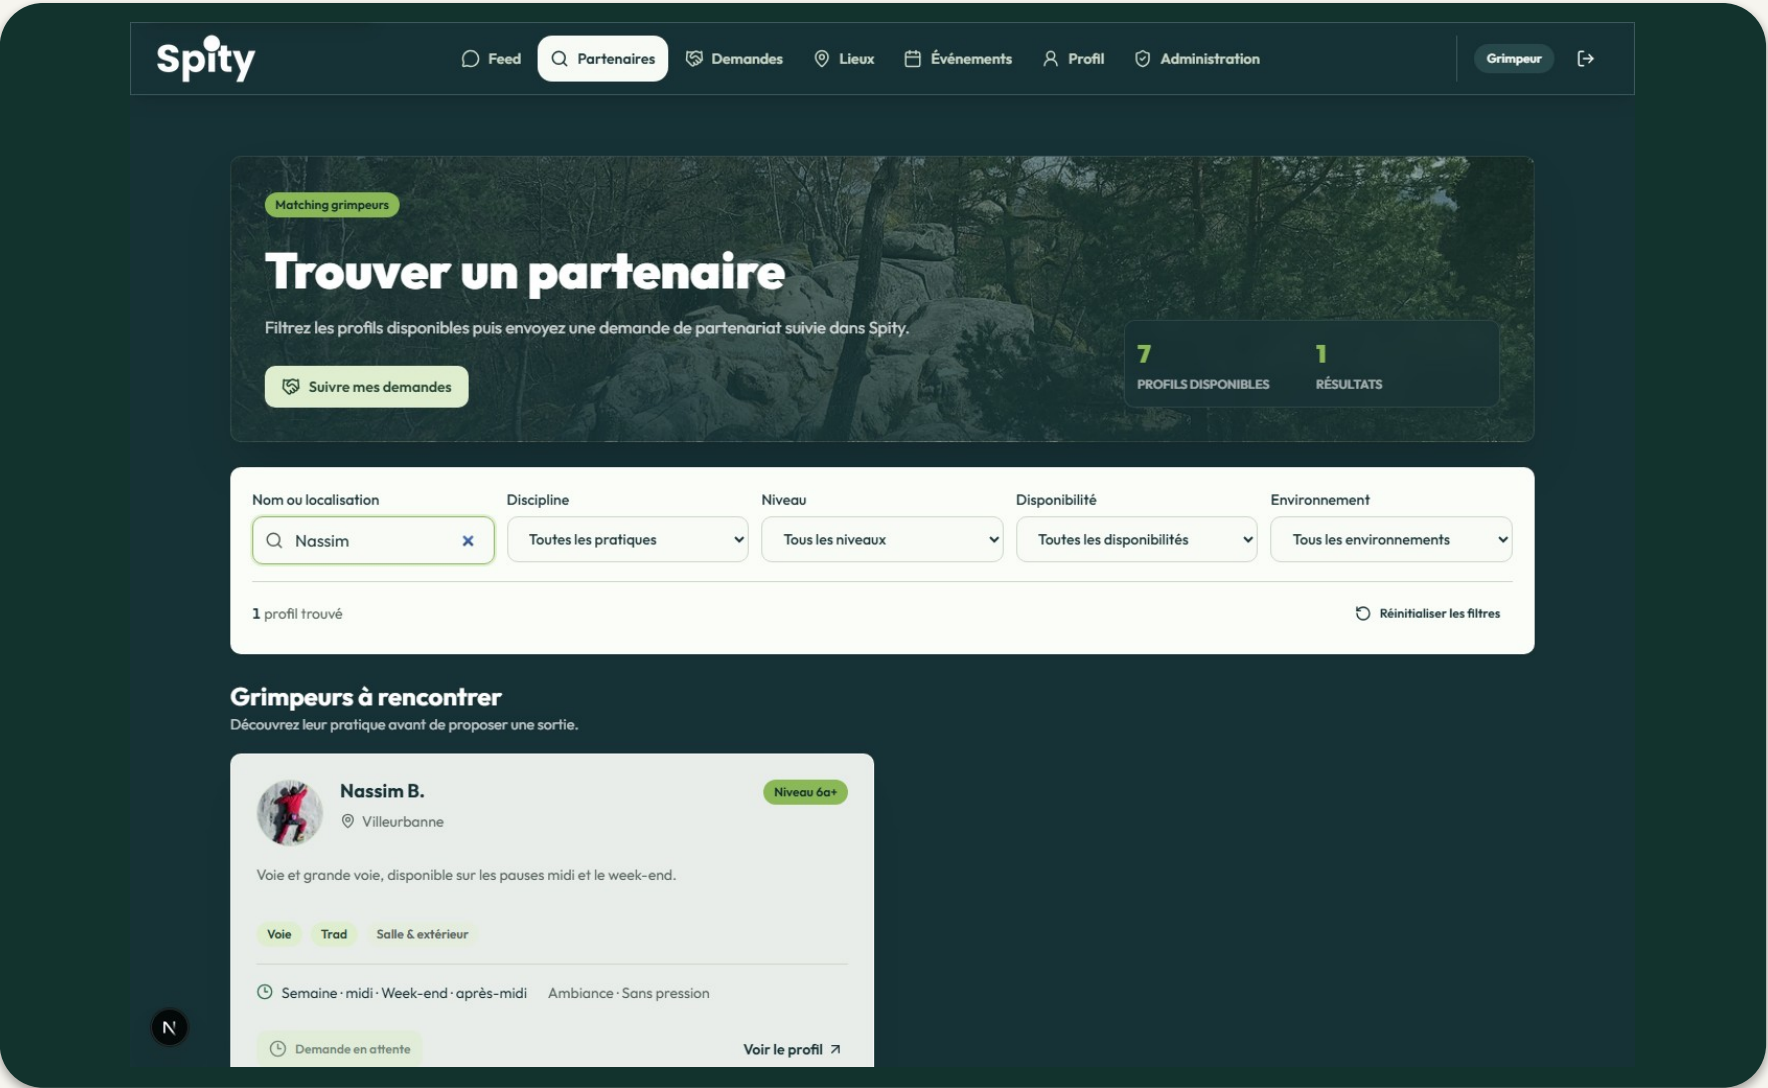

01

Profil

02

Filtres


03

Demande

Interface du 15/09/2026 · données de démo

S’inscrire et retrouver les participants

Parcours grimpeur puis club.

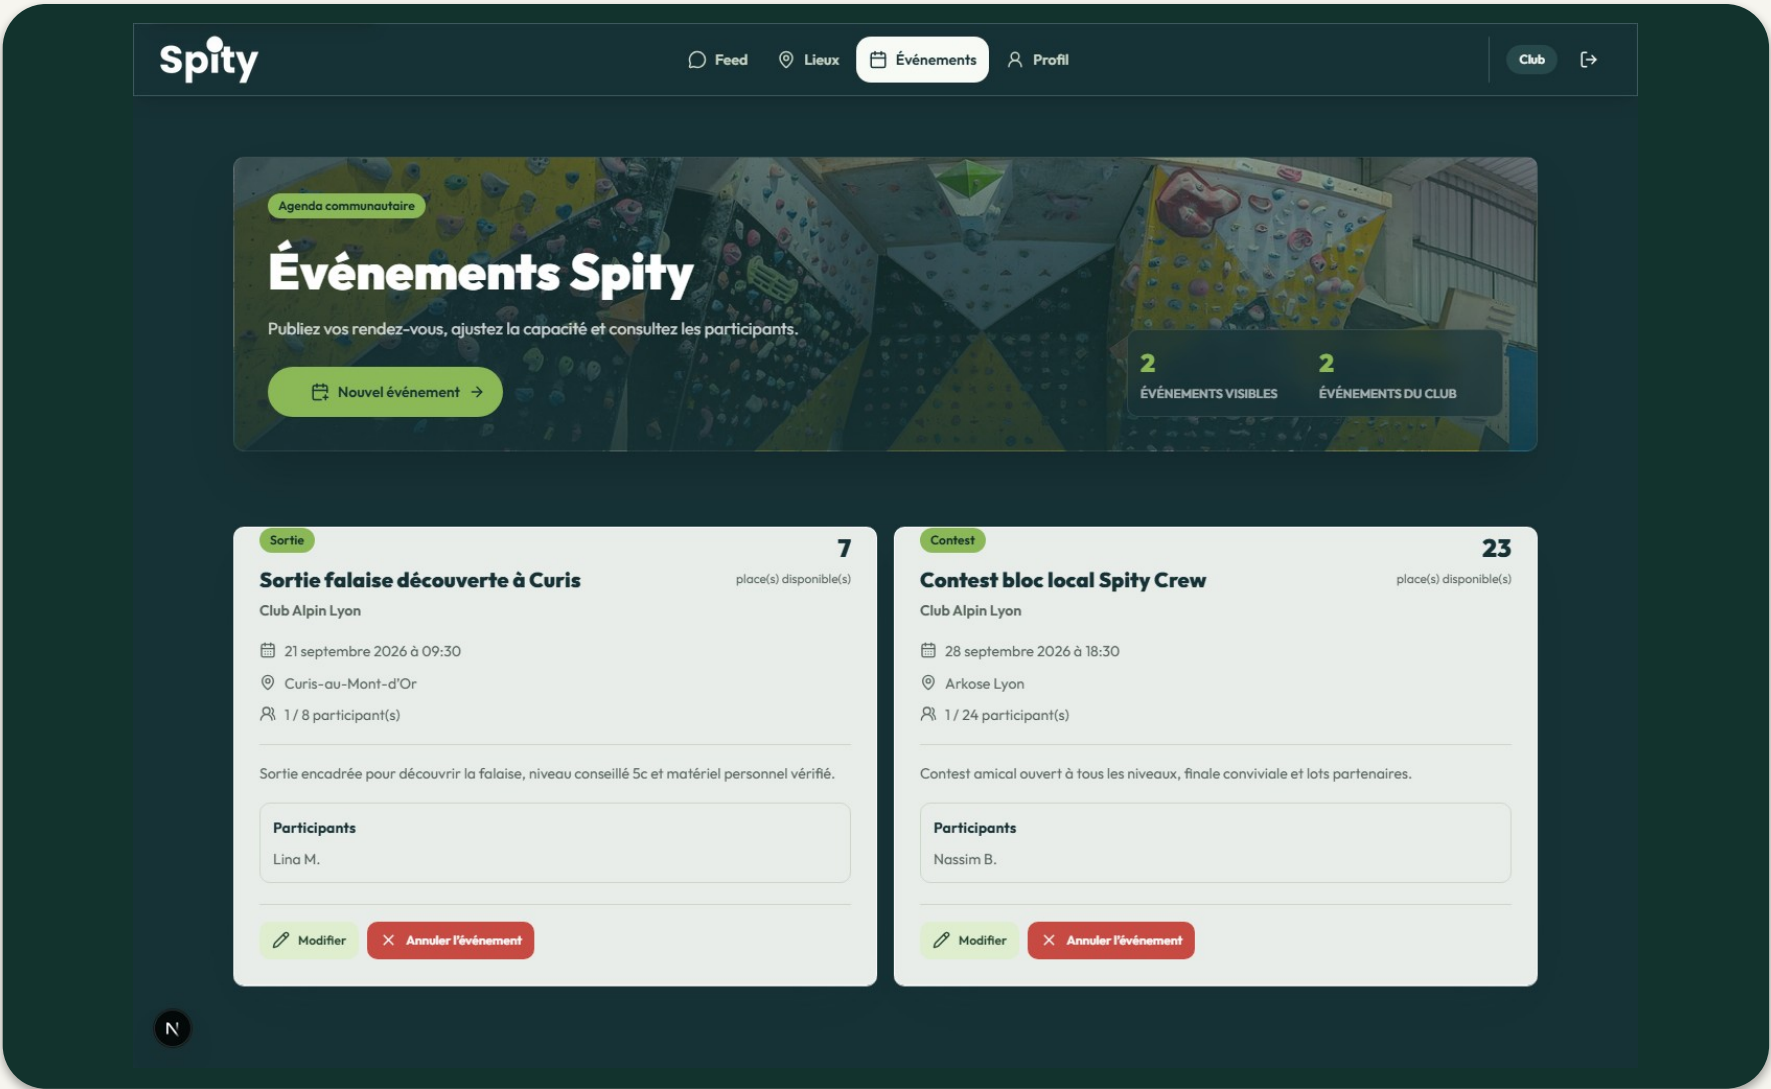

01

Événement

02

Inscription

03

Participants

Interface du 15/09/2026 · données de démo

Conclure par une décision de validation

Un bilan des résultats et des suites à donner.

DÉMONSTRATION

Critères observés

Partenaire, inscription, participants et utilisation au clavier.

DÉCISION

Accepté / avec réserve / refusé

Une décision fondée sur les critères et les résultats observés.

SUITE

Traiter les réserves

Un problème, une action, un responsable et une échéance.

Une réserve donne lieu à une action, un responsable et une prochaine vérification.

Synthèse du pilotage

Organisation, décisions et critères de validation.

Axe	Support	Décision associée
Organisation	Planning et priorités	Ordonner les tâches et préparer les jalons
Avancement	Tickets et critères	Vérifier le périmètre réellement terminé
Écarts	Prévision de charge, coût et délai	Actualiser la prévision et le périmètre
Qualité	Recette et mesures	Corriger les blocages et vérifier le résultat
Collaboration · simulation	Missions, compétences et accessibilité	Adapter le travail et l'accompagnement
Suivi client · simulation	Compte rendu et objectifs de satisfaction	Préparer les arbitrages et la réception
Validation	Démonstration et réserves	Accepter ou définir les actions restantes

Relier le besoin, le travail réalisé et le résultat attendu.

Les étapes enregistrées dans Git

Jalons de développement issus de l'historique des versions.

1 an

projet solo

De la conception
à la livraison

JAN. 2026

Fondations

Next.js, Tailwind, Drizzle

MAI

Premiers parcours

Connexion, profils, lieux

JUILLET

Prototype testé

Matching, événements, CI

AOÛT

Maintenance

Supervision, incidents, qualité

SEPT.

Livraison enrichie

Médias, administration, topos

Les commits datent des versions ; ils ne mesurent pas les heures travaillées.

Préparer un besoin de renfort

Mise en situation · demande de renfort conditionnelle.

Rubrique	Besoin à transmettre aux ressources humaines
Déclencheur	Recette critique non maîtrisée après la formation et son évaluation
Mission	4 h de renfort QA avant la restitution ; parcours et anomalies reproductibles
Compétences	Recette navigateur, accessibilité clavier, communication écrite
Sélection / intégration	Exercice accessible sur base test ; binôme de prise en main avec le porteur
Coût indicatif	4 h × 45 € = 180 € ; hors budget de base, engagement à arbitrer
Accueil et contrôle	Accès limités, critères écrits, point de retour et validation du livrable

Confirmer la mission, la disponibilité, les modalités et le budget avant engagement.
