

SPITY

Coordonner et piloter un projet logiciel

BLOC 3 · RNCP39583

Dorian Joly

Mise en situation · pilotage d'une équipe fictive sur un an



SOMMAIRE

Le projet, puis les sept compétences du Bloc 3.

- Présenter Spity
- Planifier le projet
- Suivre l'avancement
- Arbitrer
- Manager et communiquer
- Développer les compétences
- Suivre avec le client
- Démontrer et valider

RELIER LES GRIMPEURS. SIMPLIFIER LES SORTIES.

Deux besoins concrets pour guider les fonctionnalités.

GRIMPEUR


Trouver un partenaire

Discipline, niveau et profil pour préparer une sortie.

CLUB

Organiser un événement

Places disponibles, inscriptions et liste des participants.

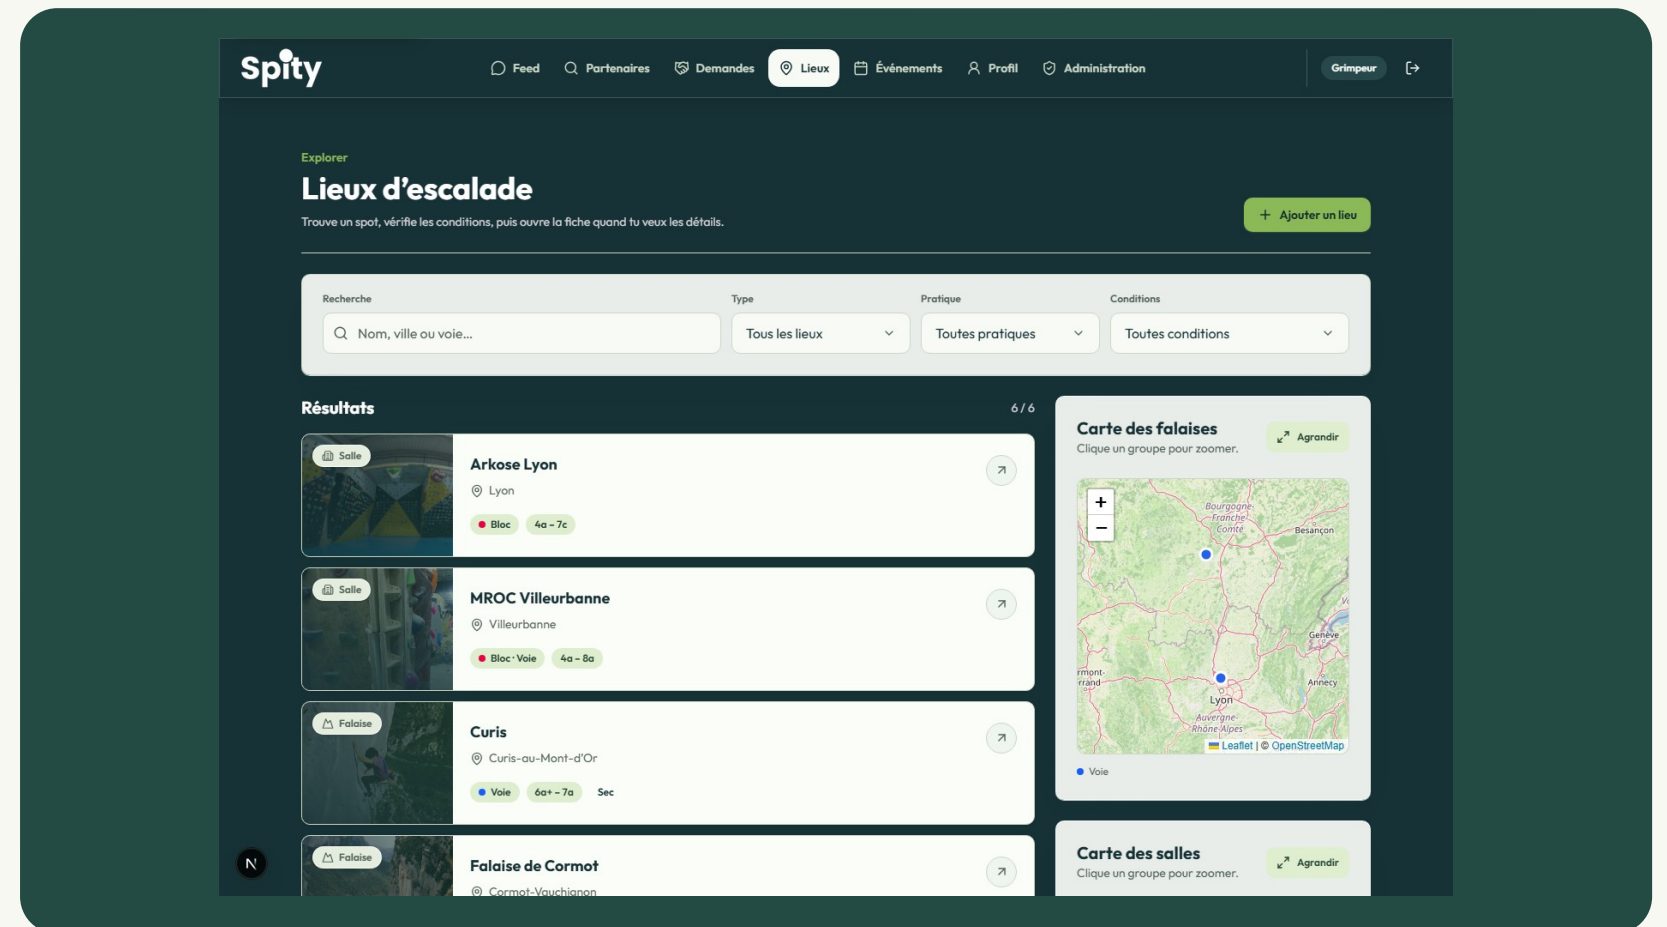

Parcours présenté : partenaire → événement → inscription.

ORGANISER LE TRAVAIL DE L'ÉQUIPE

Mise en situation · un responsable et un critère de fin pour chaque tâche.

PILOTAGE

Dorian

Priorités, responsable, échéance et critère de fin dans le backlog.

RÉALISATION

Léa + Hugo

Parcours et maquettes, puis interfaces, API et corrections.

QUALITÉ / LIVRAISON


Inès + Sami

Recette et réserves, puis version contrôlée et déploiement.

Flux du cas : à faire → en cours → revue → recette → terminé ; Dorian coordonne.

PLANIFIER LES TRAVAUX SUR UNE ANNÉE

Mise en situation · neuf lots, un pilote par lot, contributions détaillées dans le planning.

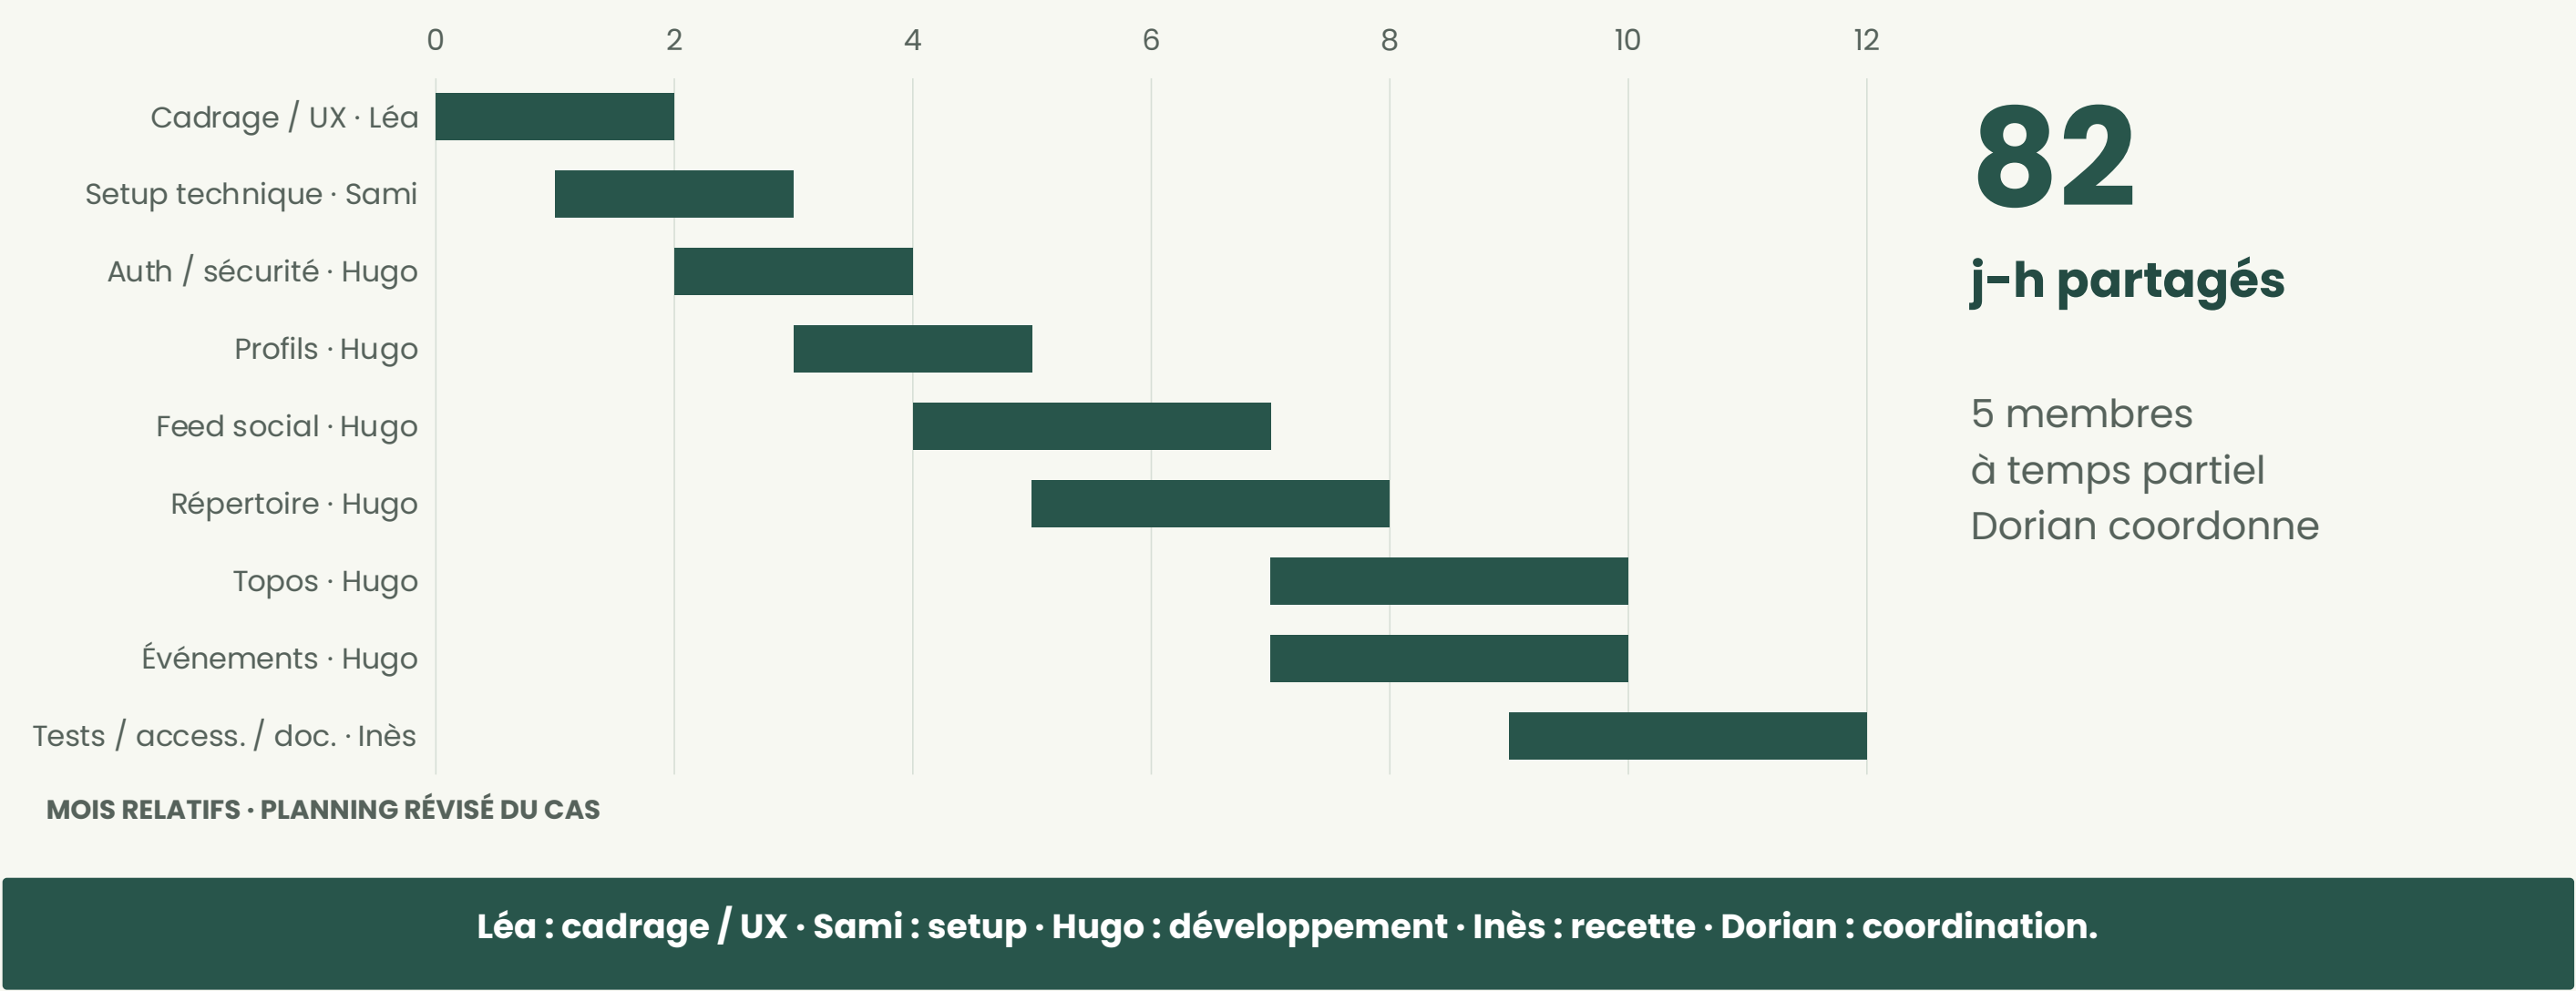

UNE ÉQUIPE, DES RESPONSABILITÉS PRÉCISES

Mise en situation · cinq membres du projet et une représentante du client.

Personne / rôle	Mission confiée	Livrable et validation
Dorian · chef de projet	Priorités, budget, charge et arbitrages	Planning et comptes rendus → Claire
Léa · UX/UI	Parcours, maquettes et accessibilité	Maquettes → Dorian ; avis d'Inès
Hugo · développement	Interfaces, API et corrections	Code et tests → revue de Sami, recette d'Inès
Inès · QA / accessibilité	Scénarios, anomalies et recontrôle	Rapport de recette → Dorian
Sami · DevOps / sécurité	Environnements, CI/CD et livraison	Version et santé → Dorian
Claire · cliente	Besoin, périmètre et réception	Décision d'acceptation côté club

Équipe fictive : missions attribuées selon les compétences ; moyens et RACI détaillés en annexe.

L'AVANCEMENT RÉEL DES FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités disponibles et suites identifiées · bilan du 16 septembre 2026.

DÉJÀ DISPONIBLE

Authentification	Inscription et connexion grimpeur / club
Profils	Disciplines, niveaux, matériel et avatar
Publications	Texte, image, likes et commentaires simples
Carte interactive	Salles et falaises géolocalisées
Topos collaboratifs	Ajout de voies, signalements, liens et PDF
Événements	Création, inscriptions et capacité

À COMPLÉTER

Sessions	Renouvellement et rotation des jetons
Publications	Modification, suppression et tags contextuels
Clubs	Carte, coachs et validation d'affiliation
Topos	Votes de consensus et modération des voies
Fil social	Personnalisation et événements épinglés
Tableau de bord club	Statistiques historiques et agrégées

Dans le scénario : Hugo réalise les suites, Inès vérifie, Sami livre et Dorian priorise.

UN TABLEAU DE BORD POUR DÉCIDER

Mise en situation · suivi annuel au mois 10.

Indicateur	Référence → prévision	Lecture et action
Charge	82 → 86 j-h	58 consommés simulés + 28 restants
Coût	44 250 → 46 050 €	+1 800 € ; réexaminer le reste à faire
Délai	Fin M11 → fin M12	+1 mois ; annoncer le nouveau jalon
Capacité de l'équipe	12 j-h prévus / 10 disponibles	Hugo : 4/3 ; Inès : 3/2 → reporter 2 j-h

Revue hebdomadaire proposée : mettre à jour les entrées, expliquer les écarts, décider et tracer.

ANTICIPER LES POINTS DE VIGILANCE

Mise en situation · signaux d'alerte et réponses associées.

Risque	Signal / seuil proposé	Action et responsable
Surcharge de l'équipe	Hugo et Inès au-delà de 100 %	Dorian : replanifier avec eux, informer Claire
Parcours non fiable	Critère critique en échec	Hugo corrige ; Inès recontrôle
Version indisponible	Connexion ou santé en échec	Sami : diagnostiquer, préparer le secours
Recette inaccessible	Consigne ou sous-titres insuffisants	Léa adapte ; Inès vérifie la compréhension

Contrôler à chaque revue : avancement, coûts, délais, risques et disponibilité des ressources.

ARBITRER FACE À UNE NAVIGATION TROP LENTE


Cas réel du 15 septembre : un calcul décoratif bloque le navigateur.

Option analysée	Intérêt	Limite / décision
Garder l'animation	Conserver tout le mouvement	Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer	Préserver potentiellement l'animation	Gain non mesuré pour cette option
Fond SVG statique	Conserver le motif sans calcul animé	Choix implémenté ; perte du mouvement

Correction réelle : fond statique. Dans le cas : Dorian arbitre, Hugo corrige, Inès recontrôle.

MESURER L'EFFET DE LA CORRECTION

Mesures locales contrôlées du 15 septembre ; un passage par parcours.

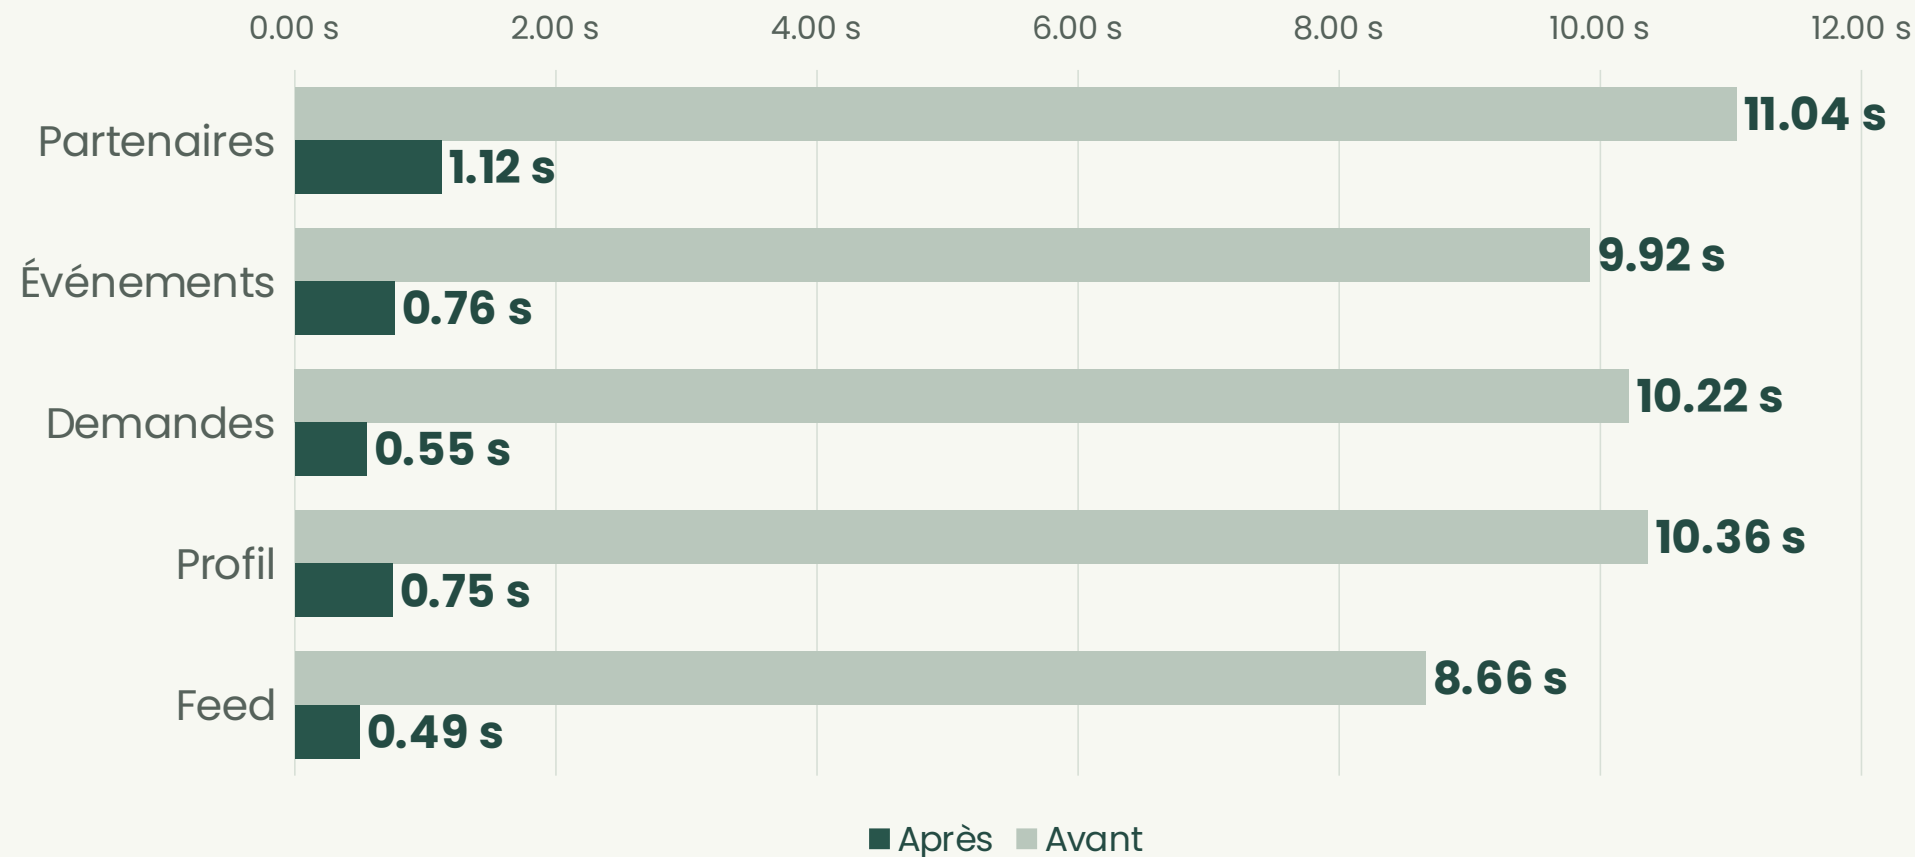

MÉDIANE OBSERVÉE

10,22 s



0,748 s

5 parcours locaux

CPU ×4 · latence 100 ms · mêmes parcours. Ces temps ne sont pas des mesures de production.

ADAPTER LA POSTURE À UNE SITUATION PRÉCISE

Mise en situation · arbitrer entre UX, développement, recette et attentes du client.

PARTICIPATIF

Écouter les faits

Léa propose une animation ;
Inès signale des blocages ;
Hugo chiffre l'effort.

PERSUASIF

Expliquer le choix

Dorian explique le compromis à Léa et à Claire.

DIRECTIF

Fixer la limite

Hugo corrige les critères critiques avant la réception.

DÉLÉGATIF

Confier la recette

Inès conduit les tests ; Sami vérifie la livraison.

Analyse critique : décider seul trop vite peut faire perdre une alerte utile ; écouter puis trancher.

ORGANISER UNE COLLABORATION ACCESSIBLE

Mise en situation · charge, accessibilité et travail à distance.

Membre	Tâches de la séance simulée	Charge / disponibilité
Dorian	Prioriser les réserves 1 h ; préparer la décision client 1 h.	2 h / 3 h
Léa	Vérifier les parcours et les libellés 1 h ; adapter les supports 1 h.	2 h / 3 h
Hugo	Préparer la version 1 h ; corriger les défauts 2 h ; tests unitaires 1 h.	4 h / 5 h
Inès	Préparer les critères 1 h ; exécuter et recontrôler 2 h ; rédiger le rapport 1 h.	4 h / 5 h
Sami	Préparer les comptes et l’environnement 1 h ; vérifier version et santé 1 h.	2 h / 3 h

Inès : écrit et sous-titres · tous : compte rendu, fuseaux, glossaire et retour asynchrone.

ÉVALUER LES COMPÉTENCES UTILES AU PROJET

Mise en situation · niveaux de départ et objectifs de progression.

Membre du cas	Compétence à vérifier	Actuel → cible
Dorian	Planning et suivi des écarts	1 → 2
Léa	Accessibilité des maquettes	1 → 2
Hugo	API et sécurité applicative	2 → 2
Inès	Recette reproductible et clavier	1 → 2
Sami	Déploiement et retour arrière	1 → 2

0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.

PRÉVOIR UNE PROGRESSION VÉRIFIABLE

Plan de formation proposé dans la mise en situation.

Membre / moment	Action de formation	Preuve d'autonomie
Dorian • avant M10	1 h : recalcul du suivi	Justifier le coût et le décalage
Léa • avant M10	1 h : audit d'une maquette	Corriger contrastes et libellés
Inès • avant M11	2 h : recette et clavier	Rejouer un cas et décrire un défaut
Sami • avant M11	1 h : retour arrière avec Hugo	Restaurer puis vérifier une version

Supports accessibles et évaluation après pratique ; renfort QA uniquement si un besoin critique persiste.

UN COMPTE RENDU QUI AIDE À DÉCIDER

Compte rendu simulé · point d'avancement au mois 10.

CONSTAT

Un écart annoncé

Prévision simulée : +1 800 € et +1 mois. Retour : garder un parcours fluide.

DÉCISION

Prioriser l'usage

Conserver le fond statique ;
maintenir les critères de recette.

ACTIONS

Préparer la validation

Dorian : suivi. Hugo : version. Inès : recette. Sami : livraison. Claire : décision.

Compte rendu structuré : contexte → faits → décision → responsable → prochaine validation.

PRÉVOIR LES POINTS DE VALIDATION

Mise en situation · validations au fil du projet.

Jalon	Livrable et responsables	Décideur / résultat
M3 · cadrage	Léa : parcours ; Dorian : périmètre	Claire confirme le besoin
M10 · évolution	Dorian : écarts ; Hugo : options	Claire arbitre coût et périmètre
M11 · recette	Inès : rapport ; Hugo : corrections	Dorian autorise la démonstration
M12 · restitution	Sami : version ; Dorian : restitution	Claire accepte, réserve ou refuse

Chaque réserve : problème précis, action, responsable et échéance à convenir.

MESURER LE RETOUR POUR AGIR

Objectifs proposés · résultats de satisfaction non mesurés.

Indicateur / responsable	Calcul / recueil	Cible pédagogique
Réussite sans aide · Inès	Parcours réussis / tentés ; noter l'effectif	≥ 80 %
Utilité perçue · Léa	Note de 1 à 5 ; moyenne et répondants	≥ 4 / 5
Conformité critique · Claire	Critères critiques acceptés / évalués	100 %
Blocages · Inès	Nombre de tâches empêchées ouvertes	0 avant acceptation

Sous la cible : qualifier → prioriser → corriger → vérifier à nouveau. Résultats : non mesurés.

LES CRITÈRES DE VALIDATION

Quatre critères pour évaluer le parcours utilisateur.

Parcours	Résultat attendu	Parcours
Partenaire	Filtres adaptés et état de demande clair	Session grimpeur
Inscription	Confirmation et capacité cohérentes	Événement de démonstration
Organisation club	Participants et commandes autorisées	Session club distincte
Utilisation	Navigation et commandes au clavier	Manipulation en direct

Dans le cas : Inès vérifie, Hugo corrige, Sami contrôle la version ; Claire prononce la réception.

DÉMONSTRATION

Du suivi du projet à l'usage du site


GRIMPEUR → CLUB

Dorian Joly

Partenaires, demandes et inscriptions aux événements

TROUVER UN PARTENAIRE

Parcours grimpeur · base de démonstration.

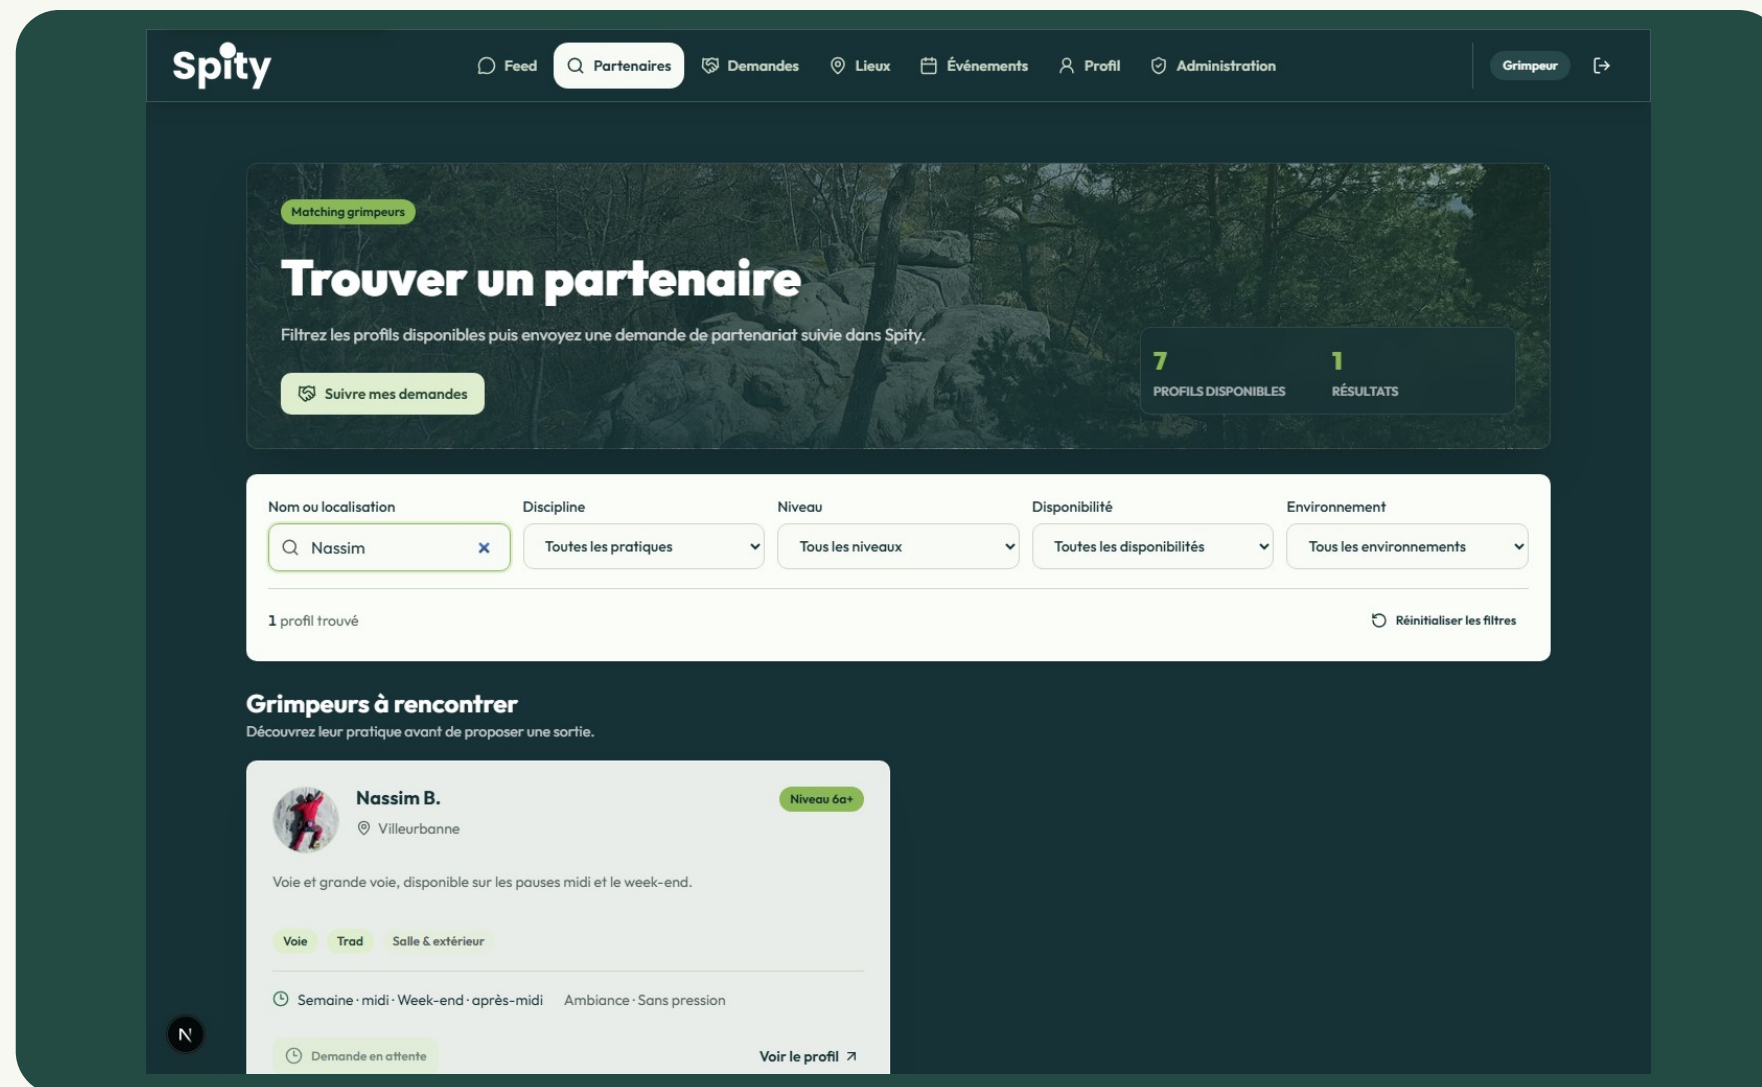

01

Profil

02

Filtres


03

Demande

Interface du 15/09/2026 · données de démo

S'INSCRIRE ET RETROUVER LES PARTICIPANTS

Parcours grimpeur puis club.

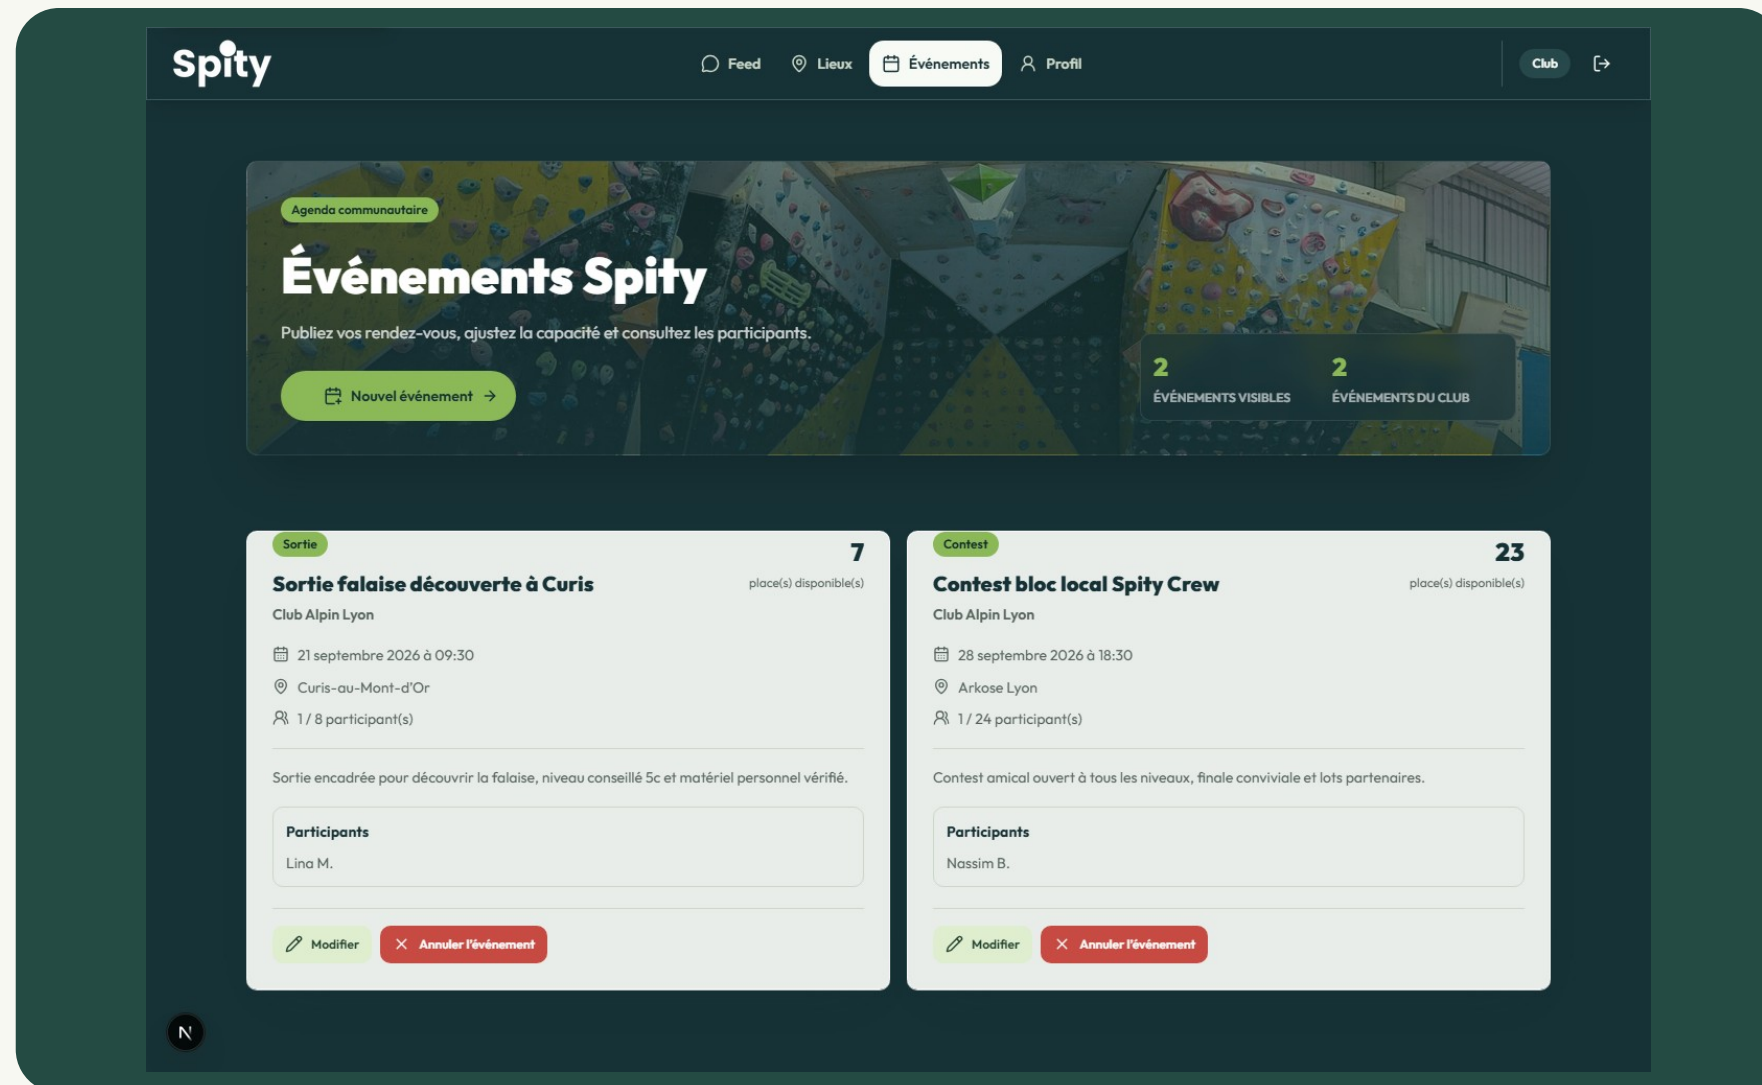

01

Événement

02

Inscription

03

Participants

Interface du 15/09/2026 · données de démo

CONCLURE PAR UNE DÉCISION DE VALIDATION

Un bilan des résultats et des suites à donner.

DÉMONSTRATION

Critères observés

Inès relève les résultats ; Sami confirme la version présentée.

DÉCISION

Accepté / avec réserve / refusé

Dorian présente le bilan ; Claire décide selon les critères.

SUITE

Traiter les réserves

Léa et Hugo corrigent ; Inès recontrôle ; Sami livre.

Une réserve donne lieu à une action, un responsable et une prochaine vérification.

SYNTHÈSE DU PILOTAGE

Organisation, décisions et critères de validation.

Axe	Responsable du cas	Décision ou livrable
Organisation	Dorian	Priorités, capacité et jalons
Expérience utilisateur	Léa	Parcours et maquettes accessibles
Réalisation	Hugo	Interfaces, API et corrections
Qualité	Inès	Recette, anomalies et recontrôle
Livraison	Sami	Version, sécurité et santé
Réception	Claire	Acceptation ou réserves

Mise en situation : je coordonne les contributions et je conserve la trace des décisions.

LES ÉTAPES ENREGISTRÉES DANS GIT

Jalons de développement issus de l'historique des versions.

1 an

projet solo

De la conception
à la livraison

JAN. 2026

Fondations

Next.js, Tailwind, Drizzle

MAI

Premiers parcours

Connexion, profils, lieux

JUILLET

Prototype testé

Matching, événements, CI

AOÛT

Maintenance

Supervision, incidents, qualité

SEPT.

Livraison enrichie

Médias, administration, topos

Les commits datent des versions ; ils ne mesurent pas les heures travaillées.

PRÉPARER UN BESOIN DE RENFORT

Mise en situation · demande de renfort conditionnelle.

Rubrique	Besoin à transmettre aux ressources humaines
Déclencheur	Compétence QA critique indisponible après formation et évaluation
Demandeur	Dorian formalise ; Inès précise les scénarios à couvrir
Mission	4 h de recette navigateur et clavier avant restitution
Profil / sélection	Exercice accessible, qualification d’anomalie et communication écrite
Coût indicatif	4 h × 45 € = 180 € ; hors base, accueil à estimer
Intégration	Inès accompagne ; Sami limite les accès ; Dorian suit le résultat

Confirmer la mission, la disponibilité, les modalités et le budget avant engagement.
